



**CHEMKOSTAV HSV akciová spoločnosť,**  
**Štefánikova 18, 066 01 HUMENNÉ**

Tel: [REDACTED] fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED] URL: [REDACTED]

## P O N U K A

na verejnú súťaž :

**„Administratívna budova (AB)  
Štefánikova 18, Humenné – rekonštrukcia  
fasády (zateplenie fasády a výmena  
výplňových konštrukcií v spoločných  
priestoroch)“**

Humenné, december 2012



**CHEMKOSTAV HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 H U M E N N É**

E-mail: [chemkostavhsv@chemkostav.sk](mailto:chemkostavhsv@chemkostav.sk) URL: [www.chemkostav.sk](http://www.chemkostav.sk)

## Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno : **Chemkostav HSV akciová spoločnosť**  
Sídlo: **Štefánikova 18  
066 01 Humenné**

Štatutárny orgán : **Ing. Milan Mňahončák  
predseda predstavenstva**

**Miroslav Bercel  
člen predstavenstva**

**Viktória Gajdošová  
člen predstavenstva**

IČO : **36 473 332**

DIČ : **202 0025227**

IČ DPH: **SK 202 0025227**

Údaj o registrácii: **Obchodný register Okresného súdu Prešov  
VI.č.10220/P**

Bankové spojenie: **[REDACTED]**  
Číslo účtu : **[REDACTED]**

Telefón : **[REDACTED]**

Fax : **[REDACTED]**

E-mail : **[REDACTED]**



**CHEMKOSTAV HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 H U M E N N É**

fax: [redacted]

E-mail: [redacted] URL: [redacted]

**Ponuka na verejnú súťaž :**

**„Administratívna budova (AB)  
Štefánikova 18, Humenné – rekonštrukcia fasády (zateplenie fasády  
a výmena výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch)“**

**Obsah predložených dokumentov:**

1. Výpis z obchodného registra
2. Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie
3. Zoznam stavebných prác za roky 2007-2011, včetně referencií
4. Vyhlásenie stavbyvedúceho, včetně osvedčenia
5. Návrh uchádzača na plnenie kritéria
6. Vyhlásenie uchádzača
7. Zábezpeka
8. Návrh ZoD
9. Stavebný rozpočet v písomnej podobe
10. Stavebný rozpočet na nosiči CD
11. Certifikát ISO 9001
12. Certifikát ISO 14001
13. Certifikát ISO 18001

Humenné, dňa 21.12.2012

[redacted]  
Ing. Milan Mihalovičák  
predseda predstavenstva

[redacted]  
Viktória Gajdošová  
člen predstavenstva

**Chemkostav HSV  
akciová spoločnosť  
H u m e n n é**

1945

1945

1945

1945

**VÝPIS  
Z OBCHODNÉHO REGISTRA  
Okresného súdu Prešov  
k dátumu 11.12.2012**

Oddiel: Sa  
Vložka číslo: 10220/P

**I. OBCHODNÉ MENO**

Chemkostav HSV akciová spoločnosť

**II. SÍDLO**

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):  
Štefánikova 18  
Názov obce: Humenné  
PSČ: 066 01

**III. IČO:** 36 473 332

**IV. DEŇ ZÁPISU:** 13.06.2001

**V. PRÁVNA FORMA:** Akciová spoločnosť

**VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)**

1. - maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. - prenájom strojov, prístrojov, zariadení, motorových vozidiel, stavebných strojov a nehnuteľných vecí vrátane bytového hospodárstva
3. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnutel'ných a nehnuteľných vecí
4. - inžinierska činnosť
5. - sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
6. - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddožávok
7. - činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
8. - vedenie účtovnej evidencie
9. - zatepl'ovanie budov
10. - výroba a predaj betónu a transportného betónu
11. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
12. - príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
13. - výroba tovarů z plástov, výroba výrobkov z plástov pre stavebníctvo
14. - činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenájatým majetkom
15. - prevádzka čerpacej stanice
16. - uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
17. - výroba stavebných prvkov z betónu
18. - prevádzka colného skladu organizácie
19. - správa registratúry
20. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
21. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
22. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300-m<sup>2</sup> a výšku 15m, drobných

- stavieb a ich zmien  
23. výkon činnosti stavbyvedúceho  
24. medzinárodná nepravidelná autobusová doprava  
25. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava  
26. vnútroštátna nákladná cestná doprava  
27. medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi

## VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

*predseda*

**Meno a priezvisko:** Ing. Milan Mňahončák

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Orechová 2357/51

**Názov obce:** Humenné

**PSČ:** 066 01

**Dátum narodenia:** [REDAKOVANÉ]

**Rodné číslo:** [REDAKOVANÉ]

**Vznik funkcie:** 03.09.2001

*člen*

**Meno a priezvisko:** Viktória Gajdošová

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Orechová 61

**Názov obce:** Humenné

**PSČ:** 066 01

**Dátum narodenia:** [REDAKOVANÉ]

**Rodné číslo:** [REDAKOVANÉ]

**Vznik funkcie:** 03.09.2001

*člen*

**Meno a priezvisko:** Miroslav Bercel

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Třebíčska 1840/14

**Názov obce:** Humenné

**PSČ:** 066 01

**Dátum narodenia:** [REDAKOVANÉ]

**Rodné číslo:** [REDAKOVANÉ]

**Vznik funkcie:** 17.04.2008

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:**

Vo všetkých veciach-zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to predseda a podpredseda alebo predseda a člen predstavenstva.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

## VIII. DOZORNÁ RADA

**Meno a priezvisko:** Ing. Dalibor Gajdoš

**Bydlisko:**

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Čsl. armády 1898/65

Názov obce: Humenné

PSČ: 066 01

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 13.06.2001

Meno a priezvisko: PhDr. Marek Mňahončák

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Hmčiarska 1699/17

Názov obce: Humenné

PSČ: 066 01

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 13.06.2001

Meno a priezvisko: Ján Harasim

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Duchnovičova 582/114

Názov obce: Medzilaborce

PSČ: 068 01

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 30.07.2009

#### IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

33 200,000000 EUR

#### X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

33 200,000000 EUR

#### XI. AKCIE

Počet: 10

Druh: kmeňové

Forma: akcie-na meno

Požoba: listinné

Ménovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

#### XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI


1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 101/2001, Nz 101/2001 zo dňa 18.5.2001, spisanej notárom JUDr. Ladislavom Vojtkom v Humennom, podľa ust. § 154 a násl. ust. zák. č. 513/91 Zb.

2. Zmena stanov a.s. schválená riadnym valnym zhromaždenim konanym dňa 16.5.2002.

3. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valnym zhromaždenim dňa 25.10.2002.

Výpis zo dňa 11.12.2012



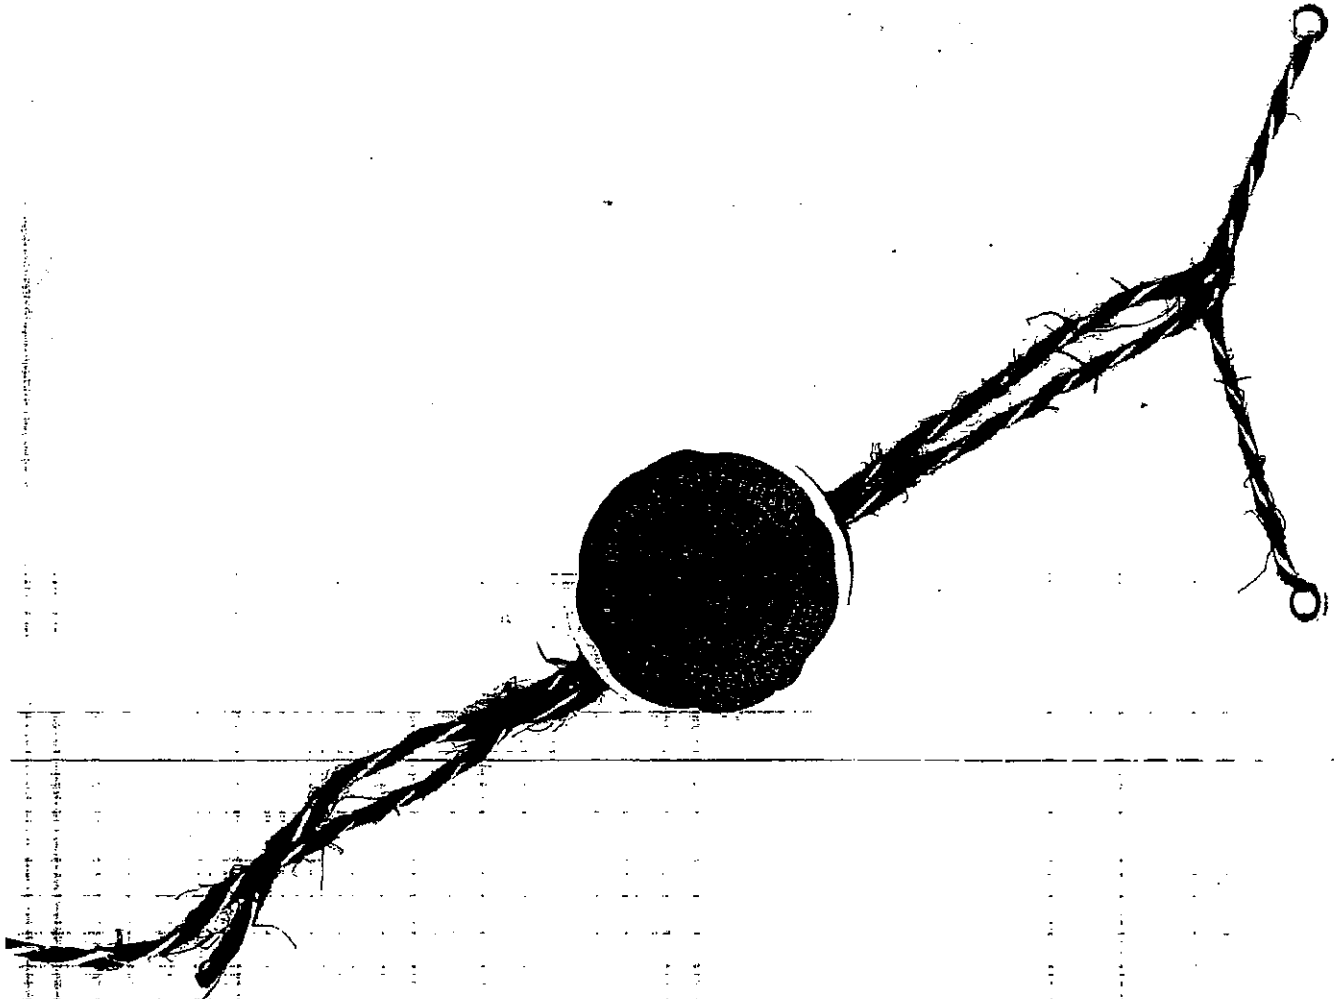



## Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 2 listu(ov) a 4 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 68/2012.

Humenné dňa 11.12.2012 11:00:53



PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM




OSVETČENEM, ŽE TATO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVETČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 6 STRÁŇ, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČI ČIASTOČNÝ), NA LISTINE BOHĽ VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY:

Humennom, dňa 18.12.2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM





## ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

# Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

**Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):** *Chemkostav HSV akciová spoločnosť*  
*Štefánikova 18*  
*066 01 Humenné*

**Predmet podnikania:**

- maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
- prenájom strojov, prístrojov, zariadení, motorových vozidiel, stavebných strojov a nehnuteľných vecí vrátane bytového hospodárstva,
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnutelých a nehnuteľných vecí,
- inžinierska činnosť,
- sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy,
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov,
- vedenie účtovnej evidencie,
- zatepľovanie budov,
- výroba a predaj betónu a transportného betónu,
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov,
- príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
- výroba tovaru z plastov, výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo,
- činnosti v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenájatým majetkom,
- prevádzka čerpacej stanice,
- uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,
- výroba stavebných prvkov z betónu,
- prevádzka colného skladu organizácie,
- správa registratúry,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m<sup>2</sup> a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,

- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- medzinárodná nepravidelná autobusová doprava,
- vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi

**Štatutárny orgán:**

*Miroslav Bercel*  
*Viktória Gajdošová*  
*Ing. Milan Mňahončák*

**Identifikačné číslo organizácie (IČO):** 36473332

**Registračné číslo v zozname podnikateľov:** 2012/02-PO-A4365

**Platnosť potvrdenia do:** 23. 02. 2013

**Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:**

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov pre Miroslav Bercel vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 11. 01. 2012, pod číslom MI033E99537B
- pre Viktória Gajdošová vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 11. 01. 2012, pod číslom MI033E995K88
- pre Ing. Milan Mňahončák vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 11. 01. 2012, pod číslom MI033E993014
- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov dňa 03. 02. 2012, pod číslom Kp 235/2012
- vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov dňa 29. 12. 2011, pod číslom NcOR 17924/11
- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
- vydal(a) Sociálna poisťovňa; pobočka Humenné, Námestie Slobody 58, 066 57 Humenné dňa 22. 12. 2011, pod číslom 23163-2/2011-HE
- vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Humenné, Mierová 13, 066 01 Humenné, dňa 22. 12. 2011, pod číslom P002114200036
- vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra dňa 02. 01. 2012, pod číslom PV11055029
- vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava dňa 30. 12. 2011, pod číslom 1477/2011/60785

- ✓ písm. e) preukázal potvrdením miestne príslušného daňového úradu vydal(a) Daňový úrad Prešov, pobočka Humenné, Štefánikova 18, 066 39 Humenné dňa 12. 01. 2012, pod číslom 9710/301/2012/736/Dem
- ✓ písm. f) preukázal dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov dňa 11. 01. 2012, pod číslom -





Ing. Drahomíra Juriková  
vedúca oddelenia  
vestníka a zoznamov


Bratislava, 17. 02. 2012

OSVEDČUJEM, ŽE TATO LISTINA DOSLOVNE SUHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÍM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 3 STRÁŇ IDE O ODPIS  
UPLNÝ (ČASŤOČNÝ). NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TETO ZMENY, DOPLNKY:

Číslom dňa: 18.12.2012

~~\_\_\_\_\_~~  
PRÁCOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM ~~\_\_\_\_\_~~









CHEM KOSTAV HSV akciová společnost  
 Štefánikova ul.18, 066 01 Humaňe  
 tel. +421 48 53 11 11  
 E-mail: info@chemkostav.com  
 URL: www.chemkostav.com

Zoznam stavebných prác uskutočnených za roky 2007,2008,2009,2010,2011

p.č.	Názov a adresa investora	Charakteristika stavby	Názov stavby	Zmluvný termín Začiatok / Ukončenie výstavby	Skutočný termín Začiatok / Ukončenie výstavby	Kontaktná osoba investora	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH	2007 bez DPH	2008 bez DPH	2009 bez DPH	2010 bez DPH	2011 bez DPH
1.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Ville la Grand ARC 33 log. Ville La Grand, FR	01/2007 / 06/2007	01/2007 / 06/2007	[REDACTED]	681 000,00 €	814 476,00 €	681 000,00 €				
2.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Les allées de Villiy le Pelloux 120 log. FR	01/2007 / 07/2008	01/2007 / 07/2008	[REDACTED]	1 874 386,00 €	2 241 765,66 €	1 163 822,74 €	690 563,26 €			
3.	[REDACTED]	pozemné stavby ubytov. zariadenie	Sci Vallon a Val Thorens, FR	05/2007 / 10/2007	05/2007 / 10/2007	[REDACTED]	355 675,00 €	425 387,30 €	365 675,00 €				
4.	[REDACTED]	pozemné stavby ubytov. zariadenie	Sci Les Hauts de Saint Martin, FR	05/2007 / 10/2007	05/2007 / 10/2007	[REDACTED]	297 830,00 €	356 204,88 €	297 830,00 €				
5.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Le Clos Bailevius 116 log. Veiraz Monthoux, FR	01/2007 / 12/2007	01/2007 / 12/2007	[REDACTED]	1 929 000,00 €	2 307 084,00 €	1 929 000,00 €				
6.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	L'Opaline 50 log. coll. Seyssel, FR	01/2007 / 12/2007	01/2007 / 12/2007	[REDACTED]	666 140,00 €	796 703,44 €	666 140,00 €				
7.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Le Pre Joumanas 78 log. GEX, FR	05/2007 / 03/2009	05/2007 / 03/2009	[REDACTED]	3 639 200,00 €	4 376 403,20 €	1 272 765,22 €	1 909 147,83 €	477 286,96 €		
8.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Les Balcons de Genève, Preyessin	07/2007 / 10/2008	07/2007 / 10/2008	[REDACTED]	1 300 000,00 €	1 554 800,00 €	487 500,00 €	812 500,00 €			
9.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Le Clos de Trevis 34 log. Thoiry	08/2007 / 10/2008	08/2007 / 10/2008	[REDACTED]	960 000,00 €	1 184 040,00 €	330 000,00 €	660 000,00 €			
10.	[REDACTED]	pozemné stavby rekonaš. práce	Rekonštrukcia 5.a č.pochodia ob.01 Fasáda-výmena okenných konštrukcií, ob.02 Interiérové stavby,právy	11/2007 / 02/2008	11/2007 / 02/2008	[REDACTED]	2 696 667,10 SK 86 189,28 €	3 209 033,85 SK 108 071,61 €	43 060,14 €	43 060,14 €			
11.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	L'Opaline II 17 log. coll. Seyssel, FR	04/2008 / 07/2008	04/2008 / 07/2008	[REDACTED]	123 000,00 €	147 109,00 €		123 000,00 €			
12.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Le Clos de Trevis II. Bal. 4 Thoiry, FR	04/2008 / 07/2008	04/2008 / 07/2008	[REDACTED]	222 754,00 €	266 413,78 €		222 754,00 €			
13.	[REDACTED]	pozemné stavby hotel	Constr. de log. saisonniers, bowling et comm. ARCS 2000 SOILES GENEVES, FR	04/2008 / 10/2008	04/2008 / 10/2008	[REDACTED]	1 107 000,00 €	1 323 972,00 €	1 107 000,00 €	1 107 000,00 €			

P.č.	Název a adresa investora	Charakteristika stavby	Název stavby	Zmluvný termín Začiatok / Ukončenie výstavby	Skladobný termín Začiatok / Ukončenie výstavby	Kontaktná osoba investora	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH	2007 bez DPH	2008 bez DPH	2009 * bez DPH	2010 bez DPH	2011 bez DPH
14.	[REDACTED]	pozemné stavby hotel	Construction résidence de tourisme à ARCS 2000 SCI La Cime des ARCS, FR	04/2008 10/2008	04/2008 10/2008	[REDACTED]	1 057 000,00 €	1 264 172,00 €		1 057 000,00 €			
15.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Le Clos des Preles 21 log. Sergy	04/2008 10/2008	04/2008 10/2008	[REDACTED]	496 400,00 €	593 694,40 €		496 400,00 €			
16.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Vente Campagnie - 6log., FR	08/2008 11/2008	09/2008 11/2008	[REDACTED]	97 500,00 €	116 610,00 €		97 500,00 €			
17.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Constr. de la Résidence Fleur des Champs 2 bal.col.+7 villas, Saint Blaise, FR	07/2008 04/2009	07/2008 04/2009	[REDACTED]	675 000,00 €	807 300,00 €		405 000,00 €	270 000,00 €		
18.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Constr. de 34 log.col.11, Allys, FR	07/2008 05/2009	07/2008 05/2009	[REDACTED]	877 000,00 €	1 046 882,00 €		478 363,64 €	388 636,36 €		
19.	[REDACTED]	pozemné stavby budovy	Rekonštrukcia objektu-Vihorňanská knížica, Humenné	12/2008 12/2009	12/2008 12/2009	[REDACTED]	391 200,50 €	466 928,60 €		32 600,04 €	358 600,46 €		
20.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Bytový dom 13 B-45 b.j. Sľúdko Pod Sokolejom, Humenné	06/2008 08/2009	09/2008 08/2009	[REDACTED]	1 532 518,12 €	1 823 696,57 €		715 175,12 €	817 348,00 €		
21.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Constr. de 27 log. Le marais Nord Crozat, FR	09/2009 08/2009	09/2009 08/2009	[REDACTED]	625 000,00 €	747 500,00 €			625 000,00 €		
22.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Le Carré Emeraude 31 log. Grenoble, FR	01/2009 05/2009	01/2009 05/2009	[REDACTED]	639 800,00 €	766 200,80 €			639 800,00 €		
23.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Les Jardins 48 log. bal.A, B, C, J, Valleyly FR	01/2009 05/2009	01/2009 05/2009	[REDACTED]	984 650,00 €	1 177 641,40 €			984 650,00 €		
24.	[REDACTED]	pozemné stavby rekonštrukcia	Rekonštrukcia s modernizáciou a príslušenstvom ZS a MS Košova	08/2009 03/2010	09/2009 03/2010	[REDACTED]	492 415,42 €	585 974,35 €			307 759,64 €	184 655,76 €	
25.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Bureau local Menuiserie Le Chalet des Neiges, FR	01/2009 05/2009	01/2009 05/2009	[REDACTED]	246 000,00 €	284 216,00 €			246 000,00 €		
26.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Les Allées du Parc 95 logis collectifs à Preussin Melens, FR	05/2009 10/2010	05/2009 10/2010	[REDACTED]	1 732 000,00 €	2 071 472,00 €			769 777,78 €	962 222,22 €	
27.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	La Bretonnière Immeuble de 6 log. Preussin Moens, FR	10/2009 04/2010	10/2009 04/2010	[REDACTED]	118 000,00 €	141 128,00 €			50 571,43 €	67 428,57 €	
28.	[REDACTED]	pozemné stavby bytové domy	Les Loges de Bostsey 64 log.+ comm. Bostsey, FR	07/2009 07/2010	07/2009 07/2010	[REDACTED]	1 498 695,00 €	1 792 439,22 €			691 705,38 €	806 989,62 €	

p.č	Nazov a adresa investora	Charakteristika stavby	Názov stavby	Zmluvný termín / Začiatok / Ukončenie výstavby	Skutočný termín / Začiatok / Ukončenie výstavby	Kontaktná osoba investora	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH	2007 bez DPH	2008 bez DPH	2009 bez DPH	2010 bez DPH	2011 bez DPH
29.	[redacted]	pozemné stavby	Pienraz-Frelaz 133 log.+ 3 domm. Tholy, FR	10/2009 11/2010	10/2009 11/2010	[redacted]	2 726 400,00 €	3 260 774,40 €			629 169,23 €	2 097 230,77 €	
30.	[redacted]	pozemné stavby	Svidník, Základná škola, Komenského ulica-obnova a rekonštrukcia	10/2008 08/2010	10/2008 08/2010	[redacted]	1 437 980,74 €	1 711 197,08 €		187 562,71 €	750 250,82 €	500 167,21 €	
31.	[redacted]	pozemné stavby	Rekonštrukcia ZS P.O.Hviezdoslava v Ština	04/2010 05/2011	04/2010 05/2011	[redacted]	556 837,59 €	675 408,30 €				340 120,55 €	228 717,04 €
32.	[redacted]	rekonštrukcia	Separatívny dvor na Štínskej ulici v Humennom	10/2010 06/2011	10/2010 06/2011	[redacted]	1 757 580,00 €	2 109 086,00 €				585 860,00 €	1 171 720,00 €
33.	[redacted]	pozemné stavby	Rés CHomoplyiles 52 logis coll-5 maisons groupées+10 maisons PLS MEYRY	11/2010 09/2011	11/2010 09/2011	[redacted]	750 000,00 €	887 000,00 €				136 364,00 €	613 636,00 €
34.	[redacted]	pozemné stavby	Rés Terrasses de l'Arc 4 baliments 129 logis locaux ORANGE	04/2010 06/2011	04/2010 06/2011	[redacted]	1 289 750,00 €	1 542 541,00 €				682 806,82 €	606 941,18 €
									7 246 823,09 €	9 037 656,73 €	8 016 551,05 €	6 363 847,54 €	2 619 014,22 €

34.

7 246 823,09 €  
9 037 656,73 €  
8 016 551,05 €  
6 363 847,54 €  
2 619 014,22 €

33 283 882,65 €

Počet stavebných prác uskutočnených za roky 2007-2011

Prestavené v roku 2007  
Prestavené v roku 2008  
Prestavené v roku 2009  
Prestavené v roku 2010  
Prestavené v roku 2011

Celkový súčet člen za zmluvy uskutočnené za roky 2007-2011

V Humennom, 21.12.2012

Ing. Milan Mihalčič  
predseda predstavenstva

Viktória Gaždiová  
člen predstavenstva

**Chemkostav HSV**  
akciová spoločnosť  
H u m e n o

### Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

~~Entreprise GILMONT & CIE  
171 avenue de Lyon - B.P. 646/3006 CHAMBERY cedex~~

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**LA GRAND ARC 33 logements VILLE LA GRAND , Francúzsko**

Jedná sa o novostavby bytových domov s 33 bytovými jednotkami.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Ville – la - Grand

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:      681 000,00 € - bez DPH  
                          133 476,00 € - 19,6% DPH  
                          814 476,00 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 01/2007  
  ukončenie: 06/2007

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.


Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:


Meno a priezvisko: ~~Philippe Fontaine~~

Podpis a pečiatka: 

OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINÁLOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRÁN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČIASTOČNÝ), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY:

V Humennom, dňa: 20.12.2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



[Redacted signature area]

### Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**OLIVA BATHING & SPA**

**Právnosť: I. J. P. 646 53886 CHAMBERY**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**LES ALLÉES DE VILLY LE PELLOUX, Francúzsko**

Jedná sa o novostavby 22 rodinných domov, 5 bytových domov s garážami.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Villy – le - Pelloux

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena: 1 874 386,00 € - bez DPH  
367 379,66 € - 19,6% DPH  
2 241 765,66 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 01/2007  
ukončenie: 07/2008

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

**Philippe Martin**

**0333 4594244**

**martin.philippe@oliva-bathing.com**

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:


Meno a priezvisko: **Philippe Martin**

Podpis a pečiatka:

OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINÁLOM (OSVEDČENÝM KÓPIJOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... 1 ..... STRÁN, IDE O ODPIŠ  
ÚPLNÝ (ČI ČASŤOČNÝ), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa: 20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



[Redacted signature area]

### Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**[REDAKOVANÉ]**

**[REDAKOVANÉ]**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**SCI VALLOU A VAL THORENS, Francúzsko**

Jedná sa o novostavbu ubytovacích zariadení v rekreačnom komplexe.  
Miesto uskutočnenia stav.prác: Val Thorens

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:  
**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena: **355 675,00 € - bez DPH**  
**69 712,30 € - 19,6% DPH**  
**425 387,30 € - s DPH**

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : **05/2007**  
ukončenie: **10/2007**

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

**[REDAKOVANÉ]**

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.  
Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: **[REDAKOVANÉ]**

Podpis a pečiatka: **[REDAKOVANÉ]**



OSVEDČUJEM, ŽE TATO LISTINA DOSLOVNE SUHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINÁLOM (OSVEDČENÝM OPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRAN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČI ČASŤOČNÝ), NA LISTINE BOĽI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom dňa 20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



### Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe


Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla: <b>Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné</b>
Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla: [REDAKOVANÉ]
Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác: <b>SCI LES HAUTS DE SAINT MARTIN, Francúzsko</b>  Jedná sa o novostavbu ubytovacích zariadení v rekreačnom komplexe. Miesto uskutočnenia stav.prác: Saint Martin  Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ: <b>Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.</b>
Zmluvná cena: <b>297 830,00 € - bez DPH</b> <b>58 374,68 € - 19,6% DPH</b> <b>356 204,68 € - s DPH</b>
Skutočná fakturovaná cena:  Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.
Obdobie realizácie zahájenie : <b>05/2007</b> ukončenie: <b>10/2007</b>
V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:  Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.
Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:  Funkcia: konateľ [REDAKOVANÉ]
Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):  Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite. Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.
Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov. [REDAKOVANÉ]  Chambéry, 01.02.2010  Potvrdenie vystavil: [REDAKOVANÉ]  Meno a priezvisko: [REDAKOVANÉ]

OSVEDČUJEM, ŽE TATO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINÁLOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... 7 ..... STRÁN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČIÁSTOČNÝ), NA LISTINE BOĽI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY.

V Humennom, dňa:

20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**[Redacted]**  
**[Redacted] S.R.L. 646 53086 CHAMBÉRY cedex**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**LE CLOS BELLEVUE 116 logements VETRAZ MONTHOUX , Francúzsko**

Jedná sa o novostavby 4 bytových domov so 116 bytovými jednotkami.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Vetraz Monthoux

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:     **1 929 000,00 € - bez DPH**  
                              **378 084,00 € - 19,6% DPH**  
                              **2 307 084,00 € - s DPH**

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : **01/2007**  
  ukončenie: **12/2007**

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

**[Redacted]**

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:


Meno a priezvisko: **[Redacted]**

Podpis a pečiatka: **[Redacted]**

OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINÁLOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 7 STRÁN, ILE O ODFIS  
ÚPLNÝ (ČIASŤOČIVÝ) NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY:

V Humennom, dňa 20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



[Redacted signature area]

### Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

~~Entreprise OLIVIA BATHMENT & CIE~~

~~Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné~~

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**L'OPALINE 50 logements coll. SEYSSEL, Francúzsko**

Jedná sa o novostavby bytových domov s 50 bytovými jednotkami.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Annecy le Vieux

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:      666 140,00 € - bez DPH  
                            130 563,44 € - 19,6% DPH  
                            796 703,44 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 01/2007  
  ukončenie: 12/2007

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

~~Philippe Baudouin~~

~~03 83 00 55 47 90 90 00 00~~

~~Mail: pbaudouin@olivias.com~~

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:


Meno a priezvisko: ~~Philippe Baudouin~~

Podpis a pečiatka:

OSVEČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINÁLOM (OSVEČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... STRÁN. IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČIASTOČNÝ), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: .....

v Humennom, dňa 20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



[Redacted signature area]

## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla: <b>Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné</b>
Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla: <b>[REDAKOVANÉ]</b> <b>[REDAKOVANÉ]</b>
Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác: <b>LE PRE JOURNANS 78 logements GEX , Francúzsko</b>  Jedná sa o novostavby 56 rodinných domov a 6 viacpodlažných bytových domov spolu 78 bytov. Miesto uskutočnenia stav.prác: Gex Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ: <b>Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.</b>
Zmluvná cena: <b>3 659 200,00 € - bez DPH</b> <b>717 203,20 € - 19,6% DPH</b> <b>4 376 403,20 € - s DPH</b>
Skutočná fakturovaná cena:  Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.
Obdobie realizácie zahájenie : <b>05/2007</b> ukončenie: <b>03/2009</b>
V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:  Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.
Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:  Funkcia: konateľ <b>[REDAKOVANÉ]</b>
Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):  Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite. Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.
Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.  Chambéry, 01.02.2010  Potvrdenie vystavil:  Meno a priezvisko: <b>[REDAKOVANÉ]</b>  <b>[REDAKOVANÉ]</b> Podpis a pečiatka:




OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRAN IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČI ČASŤOČNÝ). NA LISTINE SÓLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY:

V Humennom, dňa

20.12.2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**LES BALCONS DE GENEVE 3 immeubles PREVESSIN, Francúzsko**

Jedná sa o novostavby 3 viacpodlažných bytových domov.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Prevessin

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:     **1 300 000,00 € - bez DPH**  
                              **254 800,00 € - 19,6% DPH**  
                              **1 554 800,00 € - s DPH**

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : **07/2007**

ukončenie: **10/2008**

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

\_\_\_\_\_

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: \_\_\_\_\_


Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_

OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... 1 ..... STRÁN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČISTOČNÝ). NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa

20. 11. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**LE CLOS DE TREVIE 34 logements THOIRY, Francúzsko**

Jedná sa o novostavby bytových domov s 34 bytovými jednotkami.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Thoiry

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:            **990 000,00 € - bez DPH**  
                                  **194 040,00 € - 19,6% DPH**  
                                  **1 184 040,00 € - s DPH**

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : **08/2007**  
ukončenie: **10/2008**

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko:


Podpis a pečiatka:

OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSI OVNE SUHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINÁLOM (OSVEDČENÝM ODPIsom),  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRÁNICE O ODPIs  
ÚPLNÝ (ČIASŤOŠNÝ), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa \_\_\_\_\_

20. 12. 2017

██████████  
PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM ██████████



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**[REDAKOVANÉ]**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Rekonštrukcia 5. a 6. poschodia obj.01 Fasáda – výmena okenných konštrukcií  
a obj.02 Interiér – interiérové stavebné úpravy**  
Jedná sa o rekonštrukciu priestorov administratívnej budovy.

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ  
**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako  
priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:	<b>2 696 667,10 Sk - bez DPH</b>	<b>89 512,95 € bez DPH</b>
	<b>512 366,75 Sk - 19 % DPH</b>	<b>17 007,46 € 19 % DPH</b>
	<b>3 209 033,85 Sk - s DPH</b>	<b>106 520,41 € s DPH</b>

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : **11/2007**  
ukončenie: **02/2008**

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: majiteľ firmy  
**[REDAKOVANÉ]**

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investóra):

Stavba bola realizovaná počas prevádzky v administratívnej budove.  
Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.  
Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Humenné, 01.06.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: **[REDAKOVANÉ]**

Podpis a pečiatka:  
**[REDAKOVANÉ]**

OSVEDCUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SUHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (SEVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... 2 ..... STRÁN, IDE O ODPIS  
ÚPLNY (ČI ČIÁSTOČNÝ), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

Prílohou má byť .....  
Dňa ..... 20. 12. 2012 .....

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



[Redacted signature area]

[Redacted text]

## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**Entreprise CHAMBERY BATIMENT & CIE  
17 Avenue de Lyon - B.P. 646/5000 CHAMBERY cedex**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**L'OPALINE II 17 logements coll., Francúzsko**

Jedná sa o novostavby bytových domov so 17 bytovými jednotkami.

Miesto uskutočnenia stav.prác:

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:           **123 000,00 € - bez DPH  
                                  24 108,00 € - 19,6% DPH  
                                  147 108,00 € - s DPH**

Skutočná fakturovaná cena:

**Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.**

Obdobie realizácie zahájenie : **04/2008**  
ukončenie: **07/2008**

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmlouvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko:

Podpis a pečiatka




OSVEDČU JEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINÁLOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... 2 ..... STRÁN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČI ČIASTOČNÝ). NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa

20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

[REDAKOVANÉ]

[REDAKOVANÉ]

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**LE CLOS DE TREVIE II batiment 4 THOIRY, Francúzsko**

Jedná sa o novostavby 4 bytových viacpodlažných domov.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Thoiry

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:       222 754,00 € - bez DPH  
                          43 659,78 € - 19,6% DPH  
                          266 413,78 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 04/2008  
ukončenie: 07/2008

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

[REDAKOVANÉ]

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: [REDAKOVANÉ]

Podpis a pečiatka: [REDAKOVANÉ]

OSVEDČUJEM ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIMI SA Z ..... 7 ..... STRAN, JE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČI ČASŤOVÝ), NA LISTINE BOU VYKONANÉ  
KEĎ ZMENY, DOPLNKY

v Humennom dňa

20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**Entreprise OLIVIA BATHINGENIUS & CIE  
111 Avenue de la Cour - B-13006, CHATELAIN - cedex**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Construction de logements saisonniers, bowling et commerces à Arcs 2000  
SCI LES GENTIANES, Francúzsko**

Jedná sa o novostavbu viacpodlažného hotela s bowlingovou dráhou a obchodnými priestormi.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Bourg St Maurice

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:           **1 107 000,00 € - bez DPH**  
                                  **216 972,00 € - 19,6% DPH**  
                                  **1 323 972,00 € - s DPH**

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : **04/2008**  
  ukončenie: **10/2008**

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: **[Redacted]**


Podpis a pečiatka: **[Redacted]**

OSVEDCUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRÁN. IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČIASTOČNÝ). NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa \_\_\_\_\_

20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

[REDACTED]

[REDACTED]

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Contruction d'une résidence de tourisme à Arcs 2000, SCI La Cime des Arcs, Francúzsko**  
Jedná sa o novostavbu viacpodlažného ubytovacieho zariadenia – hotela.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Bourg St Maurice

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:       **1 057 000,00 € - bez DPH**  
                              **207 172,00 € - 19,6% DPH**  
                              **1 264 172,00 € - s DPH**

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : **04/2008**  
ukončenie: **10/2008**

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:


Meno a priezvisko: [REDACTED]

Podpis a pečiatka: [REDACTED]

OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SUHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝM DOPISEM),  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... 7 ..... STRÁNICE S ODPRÁ-  
VŔNÝMI (PRÍLOHAMI), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom dňa 20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**[REDACTED]  
[REDACTED] Avenue de Lyon [REDACTED] [REDACTED]**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**LE CLOS DES PRÊLES 21 logements+garages, Francúzsko**  
Jedná sa o novostavby bytových domov s garážami.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Sergy

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:        496 400,00 € - bez DPH  
                              97 294,40 € - 19,6% DPH  
                              593 694,40 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 04/2008  
    ukončenie: 10/2008

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: [REDACTED]


Podpis a pečiatka: [REDACTED]



OSVEDČUJEM ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SUHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝM ODPIsom),  
SKLADAJÚCÍM SA Z ..... 1 ..... STRÁN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (~~ČI STAGNÝ~~), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY:

Humennom, čna. 20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



[Illegible text, possibly a signature or stamp]

## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**[REDACTED]  
[REDACTED] - Avenue de Lyon - Bâtiment 2006 - CHAMBERY**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**VERTE CAMPAGNE 6 logements, Francúzsko**  
Jedná sa o novostavbu bytového domu so 6 bytovými jednotkami.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Gex

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:        97 500,00 € - bez DPH  
                              19 110,00 € - 19,6% DPH  
                              116 610,00 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 08/2008  
    ukončenie: 11/2008

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: [REDACTED]


Podpis a pečiatka: [REDACTED]

OSVEDČUJEM, ŽE TATO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝM ODPISOM)  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRANICE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČIÁSTOČNÝ), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa

20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**Entreprise OLIVA BATIMENT**

**Chambéry, France, B.P. 2011, 73006 CHAMBERY cedex**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Construction de la Résidence FLEUR DES CHAMPS- 2 batiments collectifs #7 villas,  
Francúzsko**

Jedná sa o novostavby 2 bytových domov s 20 bytovými jednotkami a 7 rodinných domov.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Saint Blaise

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:           675 000,00 € - bez DPH  
                                  132 300,00 € - 19,6% DPH  
                                  807 300,00 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 07/2008  
ukončenie: 04/2009

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

Philippe Martiner

tel.č. 0033479695636

e-mail: phm@olivabatiment.fr

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):


Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.


Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:


Meno a priezvisko: 

  
Podpis a pečiatka:

OSVEČUJEM, ŽE TATO LISTINA DOSLOVNE SUHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINÁLOM (OSVEČENÍM ORIGINÁLU),  
SKLADAJÍCÍM SA Z 1 STRAN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČISTOČNÝ), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

Homenon, dne 20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM \_\_\_\_\_



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

~~Entreprise OLIVABATIMENT S. R.L.S.~~

~~Chambéry, France - B.P. 646, 73006 CHAMBERY cedex~~

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Construction de 34 logements collectifs L'ALTYS, Francúzsko**  
Jedná sa o novostavby bytových domov s 34 bytovými jednotkami.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Archamps

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:       877 000,00 € - bez DPH  
                          171 892,00 € - 19,6% DPH  
                          1 048 892,00 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 07/2008  
ukončenie: 05/2009

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

Philippe Martiner

tel.č. 0033479695636

e-mail: phm@olivabatiment.fr

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.


Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: ~~Philippe Martiner~~


Podpis a pečiatka: 

OSVEDČUJEM ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... 7 ..... STRÁN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČIASŤOČNÝ). NA LISTIKE BOLI VYKONANÉ  
Tieto zmeny, doplnky: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa

20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

[REDAKOVANÉ]  
[REDAKOVANÉ]

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Rekonštrukcia objektu – Vihorlatská knižnica, Humenné**

Jedná sa o rekonštrukciu stávajúceho objektu, ktorý bol zateplený výmenou okien a výmenou azbestového obkladu za obklad Fundermax. Boli tiež prevedené aj stavebné práce v interiéri budovy.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Humenné

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena: 391. 200,50 € - bez DPH  
74 328,10 € - 19,0% DPH  
465. 528,60 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 12/2008  
ukončenie: 12/2009

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:  
Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: riaditeľka  
[REDAKOVANÉ]

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.  
Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

V Humennom, dňa 25.01.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: [REDAKOVANÉ]

[REDAKOVANÉ]  
[REDAKOVANÉ]  
[REDAKOVANÉ]  
Podpis a pečiatka:




OSVEDCUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SUHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINÁLOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... 2 ..... STRANICE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČIASTOČNÝ). NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa

20. 12. 2012

~~.....~~  
PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM





# MESTO HUMENNÉ

Č.j. : 410 /2008  
Humenné 12.02.2010

Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18  
066 01 Humenné

VEC:

Zaslanie referenčného listu.

Bytový dom 13 B – 45 b.j, Sídliisko pod Sokolejom v Humennom je novostavba, pôdorysné navrhnutá v tvare „U“. Objekt je päť podlažný bez výtahov s obytným podkrovím zastrešený manzardovou strechou. Vstup do objektu je riešený štyrmi vchodmi.

Zastrešenie objektu je škridľou Bramac Max červenej farby. Fasáda je farebné riešená stierkou Baumit.

Bytový dom je napojený na existujúce inžinierske siete riešené v územnom pláne zóny. Stavbu zrealizoval CEMKOSTAV HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18 Humenné.

Realizačná cena stavby bez DPH je 1 532 518,12 €.

Celková Σ DPH je 291 178, 45 €.

Cena stavby vrátane DPH je 1 823 696,57 €.

S realizáciou výstavby sa začalo v mesiaci jún 2008.

Skutočný termín odovzdania stavby august 2009.

Stavba je zrealizovaná v kvalite dobrej.

Odberateľ potvrdzuje horeuvedené údaje stavby.

Kontaktná osob Ing. Marián Šalata.

S pozdravom



[Redacted signature]

Ing. Anton Klamár  
prednosta úradu

Adresa: [Redacted]

Telefón: [Redacted]  
Telefax: [Redacted]  
e-mail: [Redacted]


IČO: 323 021  
DIČ: 2021232598

Bankové spojenie: [Redacted]

OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SUHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÍM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRAN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČIACIČNÝ). NA LISTINE BOLI VYKONÁNE  
TIETO ZMENY, DOPLNKY:

Humenné, dňa 20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

~~Entreprise OLIVA BATIMENTI & CIE~~

~~11 Avenue de Lyon - Bât. 045/7000 - CHAMBERY cedex~~

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Construction de 27 logements-Le marais Nord, Francúzsko**

Jedná sa o novostavby bytových domov s 27 bytovými jednotkami.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Crozet

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:        625 000,00 € - bez DPH  
                             122 500,00 € - 19,6% DPH  
                             747 500,00 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 03/2009

ukončenie: 08/2009

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

~~Príjmový zmluvník~~

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko:

Podpis a pečiatka:

OSVEDCUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNĚ SUHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (S VYKONANÝM OPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRAN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČI ČASŤOČNÝ). NA LISTINE BOĽI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dne

20. 6. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**[Redacted Name and Address]**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**LE CARRE EMERAUDE 31 logements, Francúzsko**

Jedná sa o novostavby bytových domov s 31 bytovými jednotkami.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Grenoble

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18,066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:       **639 800,00 € - bez DPH**  
                                  **125 400,80 € - 19,6% DPH**  
                                  **765 200,80 € - s DPH**

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : **01/2009**  
  ukončenie: **05/2009**

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

**[Redacted Name and Contact Information]**

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:


Meno a priezvisko: **[Redacted Name]**

**[Redacted Signature and Stamp]**  
Podpis a pečiatka:

OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SUHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... 1 ..... STRÁNI, ILE O ODPIS  
UPLNÝ (ČIÁSTOČNÝ). NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY:

V Humennom, dňa: 20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



[Redacted text block]

[Redacted text block]

## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**OLIKA BATHMENT SA**

**Chambéry, B.P. 028, 73006 CHAMBERY cedex**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**LES JARDINS 49 logements bat.A,B,C,I, Francúzsko**

Jedná sa o novostavby 4 bytových domov so 49 bytovými jednotkami.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Valleiry

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ.

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:           984 650,00 € - bez DPH  
                                  192 991,40 € - 19,6% DPH  
                                  1 177 641,40 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 01/2009  
ukončenie: 05/2009

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko:


Podpis a pečiatka:



OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝM OBMEROM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRANICE S ODPIS  
ÚPLNÝ (ČIASTOČNÝ) NA LISTINE BOL VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa 20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM \_\_\_\_\_



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**[REDAKOVANÉ]**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Rekonštrukcia s modernizáciou a prístavbou ZŠ a MŠ Koškovce**

Jedná sa o rekonštrukciu s modernizáciou a prístavbou základnej a materskej školy.

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:  
**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:       **492 415,42 € - bez DPH**  
                              **93 558,93 € - 19 % DPH**  
                              **585 974,35 € - s DPH**

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : **08/2009**  
  ukončenie: **03/2010**

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: starostka obce  
**[REDAKOVANÉ]**

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):


Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.  
Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Koškovce, 12.04.2010

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: **[REDAKOVANÉ]**



Podpis a pečiatka: **[REDAKOVANÉ]**

OSVEDCUJEM, ŽE TATO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINÁLOM (OSVEDČENÝM DOKUMENTOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... 1 ..... STRAN IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČI: STOČNÝ), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa ..... 20. 12. 2012 .....

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM \_\_\_\_\_



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**[REDAKOVANÉ]**

**[REDAKOVANÉ]**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**BUREAUX+LOCAL MENUISERIE Le Chalet des Neiges, Francúzsko**

Jedná sa o novostavbu administratívnej budovy s prístavbou.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Val Thorens

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:       246 000,00 € - bez DPH  
                          48 216,00 € - 19,6% DPH  
                          294 216,00 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 01/2009  
ukončenie: 05/2009

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 01.02.2010

Potvrdenie vystavil:


Meno a priezvisko: **[REDAKOVANÉ]**

Podpis a pečiatka: **[REDAKOVANÉ]**

OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOBROUVE SÚHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (PRAVÝM ZNENÍM DEKRETOU)  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... 1 ..... STRÁNIDE S ODPIS  
ÚPLNÝ (KAPITÓLÝ), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa 20. 11. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM






OSVEDČUJEM, ŽE TATO LISTINA DOPLŇUJE SUHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝ ODPISOM)  
SKLADAJÚCIM SA Z ..... 1 ..... STRÁN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČIASTOČNÝ), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY:

V Humennom, dňa:

20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**CHAMBÉRY IMMOBILIARITÉ SA**

**CHAMBÉRY IMMOBILIARITÉ SA, 64000 CHAMBÉRY**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**La Bretonnière immeuble de 6 logements Preveessin Moens, Francúzsko**

Jedná sa o novostavbu bytového domu so 6 bytovými jednotkami.

Miesto uskutočnenia stav.prác: Preveessin

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:  
**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:      118 000,00 € - bez DPH  
                            23 128,00 € - 19,6% DPH  
                            141 128,00 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 10/2009  
ukončenie: 04/2010

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.  
Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 04.05.2011

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko:

Podpis a pečiatka:




OSVEDČUJEM, ŽE TATO LISTINA DOSLOVNE SUHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (ČI SVETĽENÝM OBRÁZKOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRÁNIČIE O OBRIS  
ÚPLNÝ (ČI ČIÁSTOČNÝ), NA LISTINE BOLÍ VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY:

V Humennom, dňa

20.12.2012

~~\_\_\_\_\_~~  
PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

[Redacted]

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Les Loges de Bossey 64 logements+commerces Bossey, Francúzsko**

Jedná sa o novostavbu bytového domu so 64 bytovými jednotkami a komerčnými priestormi.  
Miesto uskutočnenia stav.prác: Bossey

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:  
**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena: 1 498 695,00 € - bez DPH  
293 744,22 € - 19,6% DPH  
1 792 439,22 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 07/2009  
ukončenie: 07/2010

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.  
Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 04.05.2011

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: [Redacted]

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted] 02/150  
42 000 004 308 150  
Podpis a pečiatka:

OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SUHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINÁLOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z ... 7 ... STRANÍDLOU ODPIS  
ÚPLNÝ (ČI ČASŤOČNÝ), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMĚNY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom dňa

20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM \_\_\_\_\_




## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla: <b>Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné</b>
Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla: <b>CHAMBERY</b>
Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác: <b>Pierraz-Frettaz 133 logements+3 commerces Thoiry, Francúzsko</b>  Jedná sa o novostavbu bytového domu s 133 bytovými jednotkami a 3 komerčnými priestormi. Miesto uskutočnenia stav.prác: Thoiry  Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ: <b>Chemkostav HSV akciová spoločnosť,Štefánikova 18,066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.</b>
Zmluvná cena: <b>2 726 400,00 € - bez DPH</b> <b>534 374,40 € - 19,6% DPH</b> <b>3 260 774,40 € - s DPH</b>
Skutočná fakturovaná cena:  Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.
Obdobie realizácie zahájenie : <b>10/2009</b> ukončenie: <b>11/2010</b>
V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:  Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.
Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:  Funkcia: konateľ <b>[redacted]</b> tel.č. <b>[redacted]</b> e-mail: <b>[redacted]</b>
Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):  Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite. Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.
Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.  Chambéry, 04.05.2011  Potvrdenie vystavil:  Meno a priezvisko: <b>[redacted]</b>  Podpis a pečiatka: <b>[redacted]</b>

OSVEČUJEM ŽE TáTO LIStINA DOsLOVNE sUHLAsI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (~~ČI PREDLOŽENÝM ODPISOM~~)  
SKLADAJÚCIM SA Z .....1..... STRÁN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (~~ČI ČASŤOČNÝ~~), NA LIStINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY:

V Humennom, dňa ..... 20. 12. 2012 .....

~~.....~~  
PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM ~~.....~~



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera -- objednávateľa a adresa sídla:

**[REDAKOVANÉ]**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Svidník, Základná škola, Komenského ulica- obnova a rekonštrukcia**

Jedná sa o rekonštrukciu s modernizáciou základnej školy.

V interiéri školy boli prevedené nové podlahy, nové vnútorné omietky, nové sociálne zariadenia, zdravotnícké a kúrenárske inštalácie. Boli vymenené okná, zateplený obvodový a strešný plášť. Bolo zrekonštruované ihrisko so zavlažovacím systémom, nové oplatenie.

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ.**

Zmluvná cena:       **1 437 980,74 € - bez DPH**  
                              **273 216,73 € - 19 % DPH**  
                              **1 711 197,08 € - s DPH**

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : **10/2008**  
ukončenie: **08/2010**

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: koordinátor OV, D, ŽP a RR

Ing. **[REDAKOVANÉ]** tel.č. **[REDAKOVANÉ]** e-mail: **[REDAKOVANÉ]**

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Svidník, 12.08.2011

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: **[REDAKOVANÉ]**


Podpis a pečiatka: **[REDAKOVANÉ]**

(1)

OSVEDCUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SUHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (ORIGINALOM)  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRÁN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ŠTĽOČNÝ). NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY:

V Humennom, dňa 20. 11. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



### Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

~~Obec Snina, Miestny úrad, Štefánikova 2000/95, 066 01 Snina~~

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Rekonštrukcia Základnej školy P.O.Hviezdoslava v Snine**

Jedná sa o rekonštrukciu základnej školy.

V interiéri školy boli prevedené nové podlahy, nové sociálne zariadenia, zdravotnícke a kúrenárske inštalácie.

Na budove školy boli vymenené okná, zateplený obvodový plášť, vymenená strešná krytina s novým odvodňovacím systémom.

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ.**

Zmluvná cena: 566 837,59 € - bez DPH  
91 139,60 € - 19 % DPH  
17 431,11 € - 20 % DPH  
675 408,30 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 04/2010  
ukončenie: 06/2011

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: OV, ÚP, ŽP a SP- vedúca

Ing. [redacted] tel.č. [redacted]

e-mail: [redacted]

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.

Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Snina, 12.08.2011



[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: [redacted] Lydka Čuková


Podpis a pečiatka:



OSVEDČUJEM, ŽE TATO LISTINA DOSLOVNE SUHLASI  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (~~OSVEDČENÝM~~ ~~OPISOM~~)  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRÁNICE O OPIS  
ÚPLNÝ (~~ČISTÝ~~), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa 20. 12. 2012

~~\_\_\_\_\_~~  
PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM ~~\_\_\_\_\_~~



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

[REDAKOVANÉ]

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom**

Jedná sa o výstavbu haly so separačnou linkou, rekonštrukciu administratívnej budovy, inžinierske siete a spevnené plochy.f

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ.**

Zmluvná cena: 1 757 580,00 € - bez DPH  
351 516,00 € - 20 % DPH  
2 109 096,00 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 10/2010  
ukončenie: 06/2011

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: odbor ÚP a výstavby

tel.č. [REDAKOVANÉ]

e-mail: [REDAKOVANÉ]


Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.  
Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Humenné, 13.02.2012

Potvrdenie vystavil:




Meno a priezvisko: [REDAKOVANÉ]

Podpis a pečiatka [REDAKOVANÉ]

OSVEDCUJEM, ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SUHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRAN IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČI ČASŤOČNÝ). NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa 20.11.2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM \_\_\_\_\_



## Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

[REDAKOVANÉ]

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Les Chlorophylles 52 logts.coll.+ 5 maisons groupées+10maisons PLS MERY**

Jedná sa o novostavbu bytových domov .

Miesto uskutočnenia stav.prác: Orange

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,Štefánikova 18,066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:           750 000,00 € - bez DPH  
                                  147 000,00 € - 19,6% DPH  
                                  897 000,00 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 11/2010  
ukončenie: 09/2011

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

[REDAKOVANÉ] tel.č. [REDAKOVANÉ] - e-mail: [REDAKOVANÉ]

Vyjadrenie zmluvného partnera ( investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.  
Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 08.02.2012

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: [REDAKOVANÉ]

[REDAKOVANÉ]  
[REDAKOVANÉ]  
[REDAKOVANÉ]  
[REDAKOVANÉ]

Podpis a pečiatka:

OSVEDČUJEM ŽE TÁTO LISTINA DOSLOVNE SÚHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÝM ODPISOM),  
SKLADAJÚCM SA Z ..... STRÁN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČIASTOČNÝ), NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
NIETO ZMENY, DOPLNKY:

V Humennom, dňa

20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



### Referenčný list-potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov obchodné meno zhotoviteľa a adresa sídla:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné**

Názov a obchodné meno zmluvného partnera – objednávateľa a adresa sídla:

**SAINT-PIERRE OLIVIA PATRIMENT & CIE**

**Wittmannstraße 1, Lyon - FR 69616, 7300610 CHAMBERY cedex**

Názov a charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

**Les Terrasses de l'Arc 4 bâtiments 129 lgts+locaux ORANGE**

Jedná sa o novostavbu 4 bytových domov so 129 bytovými jednotkami .

Miesto uskutočnenia stav.prác: Orange

Vyjadrenie investora, či dodávateľ realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť,Štefánikova 18,066 01 Humenné realizoval dielo ako priamy zmluvný uchádzač.**

Zmluvná cena:      1 289 750,00 € - bez DPH  
                                 252 791,00 € - 19,6% DPH  
                                 1 542 541,00 € - s DPH

Skutočná fakturovaná cena:

Zmluvná cena bola dodržaná a vyfakturovaná v plnej výške.

Obdobie realizácie zahájenie : 04/2010  
ukončenie: 08/2011

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:

Realizácia diela prebiehala v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Údaje na kontaktnú osobu objednávateľa:

Funkcia: konateľ

**[REDACTED]**

tel.č. **[REDACTED]**

e-mail: **[REDACTED]**

Vyjadrenie zmluvného partnera (investora):

Práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite.  
Investor oceňuje odborný a profesionálny prístup pracovníkov zhotoviteľa.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

Chambéry, 08.02.2012

Potvrdenie vystavil:

Meno a priezvisko: **[REDACTED]**

**[REDACTED]**  
**[REDACTED]**  
**[REDACTED]**  
Podpis a pečiatka:



**CHEMKOSTAV HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 H U M E N N É**

Tel. [redacted], fax: [redacted]  
E-mail: [redacted] URL: [redacted]

**Vyhlásenie stavbyvedúceho.**  
(v zmysle zákona č.523/2003 Z.z.§ 30 ods.4.e)

Týmto vyhlasujem, že budem k dispozícii na plnenie ZoD na stavbu:

**„Administratívna budova (AB) Štefánikova 18, Humenné – rekonštrukcia fasády (zateplenie fasády a výmena výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch)“**

V Humennom, dňa 21.12.2012

[redacted]  
**Ing. Stanislav Hájník**  
stavbyvedúci

[redacted]  
**Ing. Milan M. [redacted]**  
predseda predstavenstva

[redacted]  
**Viktória Gajdosová**  
člen predstavenstva

**Chemkostav HSV**  
akciová spoločnosť  
H u m e n n é



Slovenská komora stavebných inžinierov

# Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Stanislav Hajník**

[redacted]  
rodné číslo


podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

[redacted]  
**stavbyvedúci**

[redacted]  
s odborným zameraním

**Pozemné stavby**

[redacted] evidenčným číslom **02243\*10\***



[redacted]  
21.12.2012

[redacted] Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

[redacted]  
Dátum vydania



[redacted]  
Ing. Ján Kysel  
Predseda SKSI





**CHEMKOSTAV HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 HUMENNÉ**

fax: [redacted]  
E-mail: [redacted] URL: [redacted]

**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK**

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,  
Vazovova 2, 815 11 Bratislava

Názov predmetu zákazky: „Administratívna budova (AB) Štefánikova 18, Humenné – rekonštrukcia fasády (zateplenie fasády a výmena výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch)“

Údaje: Obchodné meno uchádzača : Chemkostav HSV, akciová spoločnosť

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača : Štefánikova 18, 066 01 Humenné.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk :

Názov položky	Cena v eur bez DPH	Cena v eur s DPH
Celková cena za predmet zákazky AB Štefánikova 18, Humenné – rekonštrukcia fasády	391.113,95 €	469.336,74 €

E mailová adresa uchádzača pre potreby elektronickej aukcie: celovska@chemkostav.sk

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickej aukciu na strane uchádzača:

Meno a priezvisko : [redacted]  
telefónne číslo: [redacted]  
e-mail: [redacted]

V Humennom, dňa 21.12.2012

[redacted]  
Ing. Milan Mňahončák  
predseda predstavenstva

**Chemkostav HSV  
akciová spoločnosť  
Humenné**

[redacted]  
Viktória Gajdošová  
člen predstavenstva



**CHEMKOSTAV HSV akciová spoločnosť,  
Štefánikova 18, 066 01 HUMENNÉ**


E-mail: [chemkostav@chemkostav.sk](mailto:chemkostav@chemkostav.sk) URL: [www.chemkostav.sk](http://www.chemkostav.sk)

### Vyhlasenie uchádzača

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Administratívna budova (AB) Štefánikova 18, Humenné – rekonštrukcia fasády (zateplenie fasády a výmena výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch)“, ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstarávaní.

V Humennom, dňa 21.12.2012

  
Ing. Milan Mňahončák  
predseda predstavenstva

Viktória Gajdošová  
člen predstavenstva  


**Chemkostav HSV**  
akciová spoločnosť  
Humenné

NAŠA REF. : [REDACTED]  
VYBAVUJE : [REDACTED]  
TELEFÓN : [REDACTED]  
FAX : [REDACTED]  
V BRATISLAVE 12.12.2012

FINANČNÉ RIADITELSTVO SR  
VAZOVOVA 2  
815 11 BRATISLAVA

VEC:  
BANKOVÁ ZÁRUKA Č. 009020114609

V PRÍLOHE VÁM ZASIELAME ORIGINAL + KÓPIU BANKOVEJ ZÁRUKY Č.  
009020114609 , KTORÚ SME VYSTAVILI VO VÁŠ PROSPECH NA ZÁKLADE  
ŽIADOSTI NÁŠHO KLIENTA CHEMKOSTAV HSV AKCIOVÁ SPOLOCNOSŤ ,  
ŠTEFÁNIKOVA 18 , 066 01 HUMENNÉ .

OBDRŽANIE ORIGINALU BANKOVEJ ZÁRUKY PROSÍME POTVRDIŤ NA KÓPII  
ZÁRUKY, KTORÚ ZAŠLITE SPÄŤ NA NAŠU ADRESU.

S POZDRAVOM

PRÍLOHA: PODEĽA TEXTU

VÚB, a.s.  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava 25  
8200/04

[REDACTED]  
VEDÚCA ODDELENIA

[REDACTED]  
SPRÁVCA Špeciálnych produktov

Finančné riaditeľstvo Slovenskej  
republiky  
Vazovova 2  
815 11 Bratislava  
IČO: 42 499 500

Bratislava, 12.12.2012

Naša záruka č. 009020114609

Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť Chemkostav HSV akciová spoločnosť, so sídlom Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 36 473 332, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10220/P (ďalej ako Uchádzač) Vám predloží ako obstarávateľovi svoju ponuku (ďalej ako Ponuka) na predmet obstarávania, ktorým je: „Administratívna budova (AB) Štefánikova 18, Humenné – rekonštrukcia fasády (zateplenie fasády a výmena výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch)“, a to v súvislosti s Oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 231/2012 zo dňa 03.12.2012 pod číslom 14544-MSP, pričom v tejto súvislosti je požadované vystavenie ponukovej bankovej záruky.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155, registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B, na splnenie tejto podmienky zo strany Uchádzača, dávame svoju neodvolateľnú bankovú záruku až do výšky

**19 000,00 EUR**  
slovom: devätnásťtisíc 00/100 EURO

a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám akúkoľvek sumu alebo sumy až do celkovej výšky nami zaručenej sumy a to do 5 dní po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie na Váš účet v nej uvedený. Vo svojej výzve uvediete, že Uchádzač si nesplnil svoje záväzky voči Vám, pretože odstúpil od svojej Ponuky v lehote viazanosti ponúk.

Pre účely identifikácie bud'

- (i) Vaša písomná výzva na zaplatenie nám musí byť predložená prostredníctvom Vašej banky, ktorá potvrdí, že podpisy uvedené na Vašej písomnej výzve sú Vaš právne záväzné, alebo
- (ii) podpisy oprávnených osôb na Vašej písomnej výzve musia byť úradne overené.

Náš záväzok z tejto záruky bude automaticky redukovaný o každú platbu vykonanú nami za účelom plnenia z tejto bankovej záruky.

VUB, a.s.  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava 25  
8200/04

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572  
E-mail: info@vub.sk, www.vub.sk

Finančné riaditeľstvo Slovenskej  
republiky  
Vazovova 2  
815 11 Bratislava  
IČO: 42 499 500

Bratislava, 12.12.2012

Naša záruka č. 009020114609

Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť Chemkostav HSV akciová spoločnosť, so sídlom Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 36 473 332, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10220/P (ďalej ako Uchádzač) Vám predložil ako obstarávateľovi svoju ponuku (ďalej ako Ponuka) na predmet obstarávania, ktorým je: „Administratívna budova (AB) Štefánikova 18, Humenné – rekonštrukcia fasády (zateplenie fasády a výmena výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch)“, a to v súvislosti s Oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 231/2012 zo dňa 03.12.2012 pod číslom 14544-MSP, pričom v tejto súvislosti je požadované vystavenie ponukovej bankovej záruky.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155, registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B, na splnenie tejto podmienky zo strany Uchádzača, dávame svoju neodvolateľnú bankovú záruku až do výšky

**19 000,00 EUR**


**slovom: devätnásťtisíc 00/100 EURO**

a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám akúkoľvek sumu alebo sumy až do celkovej výšky nami zaručenej sumy a to do 5 dní po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie na Váš účet v nej uvedený. Vo svojej výzve uvediete, že Uchádzač si nesplnil svoje záväzky voči Vám, pretože odstúpil od svojej Ponuky v lehote viazanosti ponúk.


Pre účely identifikácie bud'

- (i) Vaša písomná výzva na zaplatenie nám musí byť predložená prostredníctvom Vašej banky, ktorá potvrdí, že podpisy uvedené na Vašej písomnej výzve sú za Vás právne záväzné; alebo
- (ii) podpisy oprávnených osôb na Vašej písomnej výzve musia byť úradne overené.

Náš záväzok z tejto záruky bude automaticky redukovaný o každú platbu vykonanú nami za účelom plnenia z tejto bankovej záruky.

  
VUB, a.s.  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava 25  
8200/04

Tei: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572  
E-mail: info@vub.sk, www.vub.sk

  
Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny **INTESA**  **SANPAOLO**

*Le*

Táto záruka je platná do 30. júna 2013. Po tomto termíne platnosť tejto záruky zanikne automaticky a v plnej výške bez ohľadu na to, či nám bude vrátený originál záručnej listiny alebo nie. Vaša výzva na plnenie z tejto bankovej záruky nám musí byť doručená najneskôr do vyššie uvedeného termínu.

V prípade, že najneskôr v posledný deň platnosti tejto bankovej záruky bude od Uchádzača na adresu nášho sídla doručené písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti Ponuky, platnosť tejto bankovej záruky predĺžime až do posledného dňa viazanosti Ponuky uvedeného v písomnom oznámení Uchádzača, maximálne však do 11.12.2013 (podľa toho, ktorý z uvedených dní nastane skôr) formou dodatku k tejto záruke.

Platnosť tejto bankovej záruky môže skončiť skorším dňom ako je posledný deň jej platnosti určený vyššie, a to


- (i) dňom nášho obdržania originálu tejto záručnej listiny; alebo
- (ii) dňom vyplatenia celej zaručenej sumy oprávnenému z tejto bankovej záruky; alebo
- (iii) dňom obdržania Vášho písomného prehlásenia, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom uvediete, že túto záruku považujete za ukončenú a vzdávate sa akéhokoľvek nároku na plnenie z nej; alebo
- (iv) dňom obdržania kópie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení Verejnej súťaže, prípadne zverejnením takéhoto rozhodnutia vo Vestníku verejného obstarávania, prípadne obdržaním kópie Vášho oznámenia Uchádzačovi o zrušení Verejnej súťaže.

Práva z tejto záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu a táto záruka platí len pre Vás.


Táto záruka sa spravuje podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky a podlieha Jednotným pravidlám pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.

Naša záruka č. 009020114609

2/2

  
vedúci tímu odboru Firemná klientela

VÚB, a.s.  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava 25  
200/04

  
správca špeciálnych produktov

Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572  
E-mail: info@vub.sk, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny **INTESA  SANPAOLO**

Finančné riaditeľstvo Slovenskej  
republiky  
Vazovova 2  
815 11 Bratislava  
IČO: 42 499 500

Bratislava, 12.12.2012

Naša záruka č. 009020114609

Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť Chemkostav HSV akciová spoločnosť, so sídlom Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 36 473 332, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10220/P (ďalej ako Uchádzač) Vám predloží ako obstarávateľovi svoju ponuku (ďalej ako Ponuka) na predmet obstarávania, ktorým je: „Administratívna budova (AB) Štefánikova 18, Humenné – rekonštrukcia fasády (zateplenie fasády a výmena výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch)“, a to v súvislosti s Oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 231/2012 zo dňa 03.12.2012 pod číslom 14544-MSP, pričom v tejto súvislosti je požadované vystavenie ponukovej bankovej záruky.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155, registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B, na splnenie tejto podmienky zo strany Uchádzača, dávame svoju neodvolateľnú bankovú záruku až do výšky

**19 000,00 EUR**  
slovom: devätnásťtisíc 00/100 EURO

a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám akúkoľvek sumu alebo sumy až do celkovej výšky nami zaručenej sumy a to do 5 dní po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie na Váš účet v nej uvedený. Vo svojej výzve uvediete, že Uchádzač si nesplnil svoje záväzky voči Vám, pretože odstúpil od svojej Ponuky v lehote viazanosti ponúk.

Pre účely identifikácie bud'

- (i) Vaša písomná výzva na zaplatenie nám musí byť predložená prostredníctvom Vašej banky, ktorá potvrdí, že podpisy uvedené na Vašej písomnej výzve sú za Vás právne záväzné; alebo
- (ii) podpisy oprávnených osôb na Vašej písomnej výzve musia byť úradne overené.

Náš záväzok z tejto záruky bude automaticky redukovaný o každú platbu vykonanú nami za účelom plnenia z tejto bankovej záruky.

VÚB, a.s.  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava 25  
8200/04

Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572  
E-mail: info@vub.sk, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny **INTESA  SANPAOLO**

Táto záruka je platná do 30. júna 2013. Po tomto termíne platnosť tejto záruky zanikne automaticky a v plnej výške bez ohľadu na to, či nám bude vrátený originál záručnej listiny alebo nie. Vaša výzva na plnenie z tejto bankovej záruky nám musí byť doručená najneskôr do vyššie uvedeného termínu.

V prípade, že najneskôr v posledný deň platnosti tejto bankovej záruky bude od Uchádzača na adresu nášho sídla doručené písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti Ponuky, platnosť tejto bankovej záruky predĺžime až do posledného dňa viazanosti Ponuky uvedeného v písomnom oznámení Uchádzača, maximálne však do 11.12.2013 (podľa toho, ktorý z uvedených dní nastane skôr) formou dodatku k tejto záruke.

Platnosť tejto bankovej záruky môže skončiť skorším dňom ako je posledný deň jej platnosti určený vyššie, a to


- (i) dňom nášho obdržania originálu tejto záručnej listiny; alebo
- (ii) dňom vyplatenia celej zaručenej sumy oprávnenému z tejto bankovej záruky; alebo
- (iii) dňom obdržania Vášho písomného prehlásenia, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom uvediete, že túto záruku považujete za ukončenú a vzdávate sa akéhokoľvek nároku na plnenie z nej; alebo
- (iv) dňom obdržania kópie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení Verejnej súťaže, prípadne zverejnením takéhoto rozhodnutia vo Vestníku verejného obstarávania, prípadne obdržaním kópie Vášho oznámenia Uchádzačovi o zrušení Verejnej súťaže.


Práva z tejto záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu a táto záruka platí len pre Vás.

Táto záruka sa spravuje podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky a podlieha Jednotným pravidlám pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.

Naša záruka č. 009020114609

2/2

  
**VÚB, a.s.**  
 Mlynské nivy 1  
 829 90 Bratislava 25  
 3200/04  
 vedúci tímu odboru Firemná klientela

  
 správca špeciálnych produktov

Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572  
 E-mail: info@vub.sk, www.vub.sk

**Všeobecná úverová banka, a.s.**  
 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2  
 Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny **INTESA  SANPAOLO**



Táto záruka je platná do 30. júna 2013. Po tomto termíne platnosť tejto záruky zanikne automaticky a v plnej výške bez ohľadu na to, či nám bude vrátený originál záručnej listiny alebo nie. Vaša výzva na plnenie z tejto bankovej záruky nám musí byť doručená najneskôr do vyššie uvedeného termínu.

V prípade, že najneskôr v posledný deň platnosti tejto bankovej záruky bude od Uchádzača na adresu nášho sídla doručené písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti Ponuky, platnosť tejto bankovej záruky predĺžime až do posledného dňa viazanosti Ponuky uvedeného v písomnom oznámení Uchádzača, maximálne však do 11.12.2013 (podľa toho, ktorý z uvedených dní nastane skôr) formou dodatku k tejto záruke.

Platnosť tejto bankovej záruky môže skončiť skorším dňom ako je posledný deň jej platnosti určený vyššie, a to


- (i) dňom nášho obdržania originálu tejto záručnej listiny; alebo
- (ii) dňom vyplatenia celej zaručenej sumy oprávnenému z tejto bankovej záruky; alebo
- (iii) dňom obdržania Vášho písomného prehlásenia, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom uvediete, že túto záruku považujete za ukončenú a vzdávate sa akéhokoľvek nároku na plnenie z nej; alebo
- (iv) dňom obdržania kópie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení Verejnej súťaže, prípadne zverejnením takéhoto rozhodnutia vo Vestníku verejného obstarávania, prípadne obdržaním kópie Vášho oznámenia Uchádzačovi o zrušení Verejnej súťaže.

Práva z tejto záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu a táto záruka platí len pre Vás.

Táto záruka sa spravuje podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky a podlieha Jednotným pravidlám pre záruky vyplateľné na požiadanie, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.

Naša záruka č. 009020114609

2/2

  
 VÚB, a.s.  
 Mlynské nivy 1  
 829 90 Bratislava 25  
 8200/04

vedúci tímu odboru Firemná klientela



správca špeciálnych produktov

Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572  
 E-mail: info@vub.sk, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2  
 Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny **INTESA**  **SANPAOLO**

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S.  
ODBOR SPRÁVA AKTÍVNYCH OBCHODOV FIREMNÝCH KLIENTOV  
MLYNSKÉ NIVY 1, 829 90 BRATISLAVA  
IČO: 31 320 155  
OBCHODNÝ REGISTER: OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I  
ODDIEL : SA, VLOŽKA ČÍSLO: 341/B  
TEL. 02/5055 1690, 5055 1688, 5055 1544

DATE : 12.12.2012

KLIENT: CHEMKOSTAV HSV AKCIOVÁ SPOLOČN	FP VRANOV NAD TOPLOU FIREMNÁ POBOČKA
ŠTEFÁNIKOVA 18 066 01 HUMENNÉ	NAŠA REF: 009020114609 ISS 000

AVÍZO O ZÚČTOVANÍ ODPLÁT A POPLATKOV

BANKOVÁ ZÁRUKA Č. : 009020114609  
DÁTUM VYSTAVENIA : 12.12.2012  
PLATNOSŤ DO : 30.06.2013  
HODNOTA ZÁRUKY : 19,000.00 EUR  
ZOSTATKOVÁ HODNOTA : 19,000.00 EUR  
ŠTVRTROČNÁ ODPLATA : 0.50000 %, MIN. ODPLATA: 120.00 EUR  
UVEDENÁ ODPLATA JE ÚČTOVANÁ ZO ZOSTATKOVEJ HODNOTY ZÁRUKY ZA PRÍSLUŠNÝ ŠTVRTROK VOPRED (CENNÍK VÚB, A. S.).

DNES VÁM BOLI NAÚČTOVANÉ NASLEDOVNÉ DEBETNÉ POLOŽKY:

POLOŽKY	PŮVODNÁ MENA A ČIASTKA	KURZ
*****	ZÚČTOVACIA MENA A ČIASTKA *****	ZÁHRANIČNEJ MENY *****
POŠTOVÉ VÝLOHY	EUR 5.67	.0000000
	EUR 5.67 DR	
ODPLATA ZA ZÁRUKU	EUR 26.67	.0000000
	EUR 26.67 DR	
ODPLATA ČAS. ROZL.	EUR 93.33	.0000000
	EUR 93.33 DR	
NA ÚČET ČÍSLO	EUR	125.67 DR
VALUTA : 12/12/2012		


UPOZORŇUJEME VÁS NA POTREBU UVÁDZANIA ČÍSLA PREDMETNEJ ZÁRUKY NA PLATOBNÝCH DOKLADOCH SÚVISIACICH S REALIZÁCIOU ZÁVÄZKOV VYPLÝVAJÚCICH Z BANKOVEJ ZÁRUKY. V OPAČNOM PRÍPADE NEBUDE ZNIŽOVANÁ HODNOTA ZÁRUKY PRE ÚČELY VÝPOČTU ODPLÁT.

ODPLATY SÚ ÚČTOVANÉ POČÍTAČOM AUTOMATICKY V NOČNOM SPRACOVANÍ, A TO V PRVÝ DEŇ OBDOBIA, ZA KTORÉ ODPLATA PRINÁLEŽÍ VÚB, A. S. AK UVEDENÝ DEŇ PRIPADNE NA DEŇ PRACOVNÉHO POKOJA ALEBO SVIATOK, ODPLATA SA ZÚČTUJE V POSLEDNÝ PRACOVNÝ DEŇ PRED TÝMTO DÁTUMOM. V PRÍPADE, ŽE TERMÍN ÚČTOVANIA NASLEDUJÚCEJ ODPLATY JE KRATŠÍ AKO TERMÍN PLATNOSTI ZÁRUKY, JE TENTO TERMÍN VŽDY UVEDENÝ V AVÍZE O ZÚČTOVANÍ PRÍSLUŠNEJ ODPLATY.

NASLEDUJÚCA ODPLATA BUDE ÚČTOVANÁ S VALUTOU 12.03.2013 .  
ŽIADAME VÁS, ABY STE V UVEDENOM TERMÍNE ZABEZPEČILI DOSTAČNÉ  
FINANČNÉ ZDROJE NA VAŠOM ÚČTE. ODPLATA BUDE ZÚČTOVANÁ S UVEDENÍM  
NASLEDUJÚCICH REFERENCIÍ: KONŠT. SYMBOL 898, VARIABILNÝ SYMBOL  
009020114609 , , PRIČOM PRVÝCH PÄŤ ČÍSLIC JE NAHRADENÝCH ČÍSLOM  
792. AVÍZO O ZÚČTOVANÍ ODPLATY VÁM BUDE DORUČENÉ AŽ NÁSLEDNE.  
UVEDENÉ REFERENCIE BUDÚ VŽDY UVÁDZANÉ PRI KAŽDOM ÚČTOVANÍ  
ODPLATY, RESP. POPLATKU ZA ZMENU.

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA  
B R A T I S L A V A

AVÍZO NEOBSAHUJE PODPISY, JE VYHOTOVENÉ ELEKTRONICKY.



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády /zatepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
Objednávateľ	SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad	IČO		IČ DPH
Projektant				
Zhotoviteľ	Chemkostav HSV, a.s., Štefánikova 18, Humenné	36 473 332		SK 202 002 5227
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa		Položiek
		17. 12. 2012		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	158,45	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	311 307,61	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	49 241,58	10	Kultúra pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	30 406,32	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	391 113,95	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 391 113,95			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa			
Pečiatka				27 Kľuzavá doložka			
Chemkostav HSV				28 Zvýhodnenie			
akciová spoločnosť							
Humenné							

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasád Datum: 17. 12. 2012

Objednávateľ: SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Kataštrálny úrad Projektant:

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV, a.s., Štefánikova 18, Humenné Spracoval:

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády /zatepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./	391 113,95	78 222,79	469 336,74	0,00	391 113,95	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 Zateplenie stien severovýchodnej a juhozápadnej	189 241,93	37 848,39	227 090,32	0,00	189 241,93	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 Zateplenie steny juhoovýchodnej /FC/	107 506,42	21 501,28	129 007,70	0,00	107 506,42	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 Zateplenie steny severozápadnej	94 365,60	18 873,12	113 238,72	0,00	94 365,60	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>391 113,95</b>	<b>78 222,79</b>	<b>469 336,74</b>	<b>0,00</b>	<b>391 113,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády /zatepl. fasády a výmena výpiš. konštr.v spol. pr./	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Zateplenie stien severovýchodnej a juhozápadnej	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		17.12.2012	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	158,45	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	174 732,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	4 516,58	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	9 833,95	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		189 241,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>							<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		189 241,93
<b>Objednávateľ</b>							24	DPH 20,00 % z 189 241,93		37 848,39
Dátum a podpis				Pečiatka			25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>227 090,32</b>
<b>Zhotoviteľ</b>							<b>E Prípochy a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa		0,00
							27	Kľzavá doložka		0,00
							28	Zvýhodnanie +-		0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Administratívna budova JAB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády/zatepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./

Objekt: SO 01 Zateplenie stien severovýchodnej a juhozápadnej

Objednávateľ: SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad

Zhotoviteľ:

Dátum: 17.12.2012

JKSO:

Kód	Podla	Doklady	Minim	Časť celkom	Prívrakov celkom	Buf celkom
HBV	Práca a inštalácia HBV	168,447	174,792,957	173,891,404	933,980	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenia	168,447	129,974,486	130,032,913	49,641	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práca-búranie	0,000	44,858,491	44,858,491	884,010	0,000
RBV	Práca a inštalácia RBV	4,815,684	9,938,848	14,360,549	1,058	3,114
713	Izolácie tepelné	285,166	84,118	369,283	0,684	0,000
764	Konštrukcie kámpiarcke	0,000	8,958,763	8,958,763	0,409	0,774
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4,231,416	774,799	5,006,216	0,893	2,340
784	Dokončovacia práca - maľby	0,000	18,268	18,268	0,002	0,000
<b>Celkom</b>		<b>4 675,031</b>	<b>184 666,902</b>	<b>189 241,933</b>	<b>935,209</b>	<b>3,114</b>



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády /zatepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./

Objekt: SO 01 Zateplenie stien severovýchodnej a juhozápadnej

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 12. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 174 891,404**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 130 032,913**

30	R	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	15,660	1,193	18,682
9	R	612465115	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	83,637	1,560	130,474
8	R	612474101	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 8 mm	m2	83,637	7,299	610,466
2	R	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a vonk. sklotextílnou mrežkou	m2	116,097	3,343	388,112
1	R	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	986,760	1,235	1 218,649
4	R	622464225	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm	m2	2 046,980	16,332	33 431,277
25	R	622464311	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom , hr.zrna 2 mm	m2	56,240	20,172	1 134,473
26	R	625250152	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C -, lepený celoplošne s prikotvením hr. izolantu 40 mm-ostenie	m2	9,450	26,552	250,916
27	R	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C , lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 80 mm	m2	46,790	36,329	1 699,834
3	R	625251100	Zateplenie doskami STYRCON 200 hr.10cm bez omietky	m2	948,900	48,480	46 002,672
6	R	6252511005	Zateplenie doskami hr.10cm bez omietky vnútorné	m2	69,957	48,480	3 391,515
7	R	6252511006	Zateplenie ostenia doskami hr. 3 cm bez omietky vnútorné	m2	13,680	22,220	303,970
17	R	625251101	Vyrovnanie sten STYRCONOM a Polystyrénom 30 %	m2	449,274	22,865	10 272,650
22	R	625252040	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm zateplenie ostenia okien a dverí	m2	549,400	26,418	14 514,049
5	R	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr.10cm bez omietky	m2	548,680	25,529	14 007,252
31	R	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	10,800	4,581	49,475
32	562	5624900350	PLASTWOOD Parapet 250x25 mm	m	10,800	14,671	158,447
24	R	655000P	Stavebná úprava 14. NP	kpl	1,000	2 450,000	2 450,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 44 858,491**

13	R	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-50 m	m2	2 741,700	1,785	4 893,935
14	R	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 50 m	m2	10 966,800	1,513	16 592,768
23	R	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-50 m	m2	2 741,700	1,072	2 939,102
29	R	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	2 741,700	1,211	3 320,199
33	R	945000	Ochranná konštrukcia nad prístreškom a ochranné konštrukcie nad prístavbami	kpl	1,000	3 465,000	3 465,000
12	R	968072865	Vybúranie parapetných dosiek	m	10,800	3,353	36,212
34	R	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	t	161,280	67,436	10 876,078

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády /zatapl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./

Objekt: SO 01 Zateplenie stien severovýchodnej a juhozápadnej

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 12. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
35	R	998012025	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 48 m	t	130,732	20,600	2 693,079
19	R	998100	Poplatok za skládku	t	1,678	25,100	42,118
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>14 350,529</b>
<b>713</b>			<b>Izolácie tepelné</b>				<b>369,283</b>
36	R	713111123	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, na trne z kruhovej tyčovej ocele	m2	32,460	2,396	77,774
21	631	6314144600	Dosky cadicové Nobasil-Knauf Insulation TF 175kg/m3, hrúbka 100 mm	m2	33,109	8,613	285,168
0	R	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	1,750	3,623	6,341
<b>764</b>			<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>8 958,763</b>
10	R	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	477,600	0,849	405,482
15	R	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	56,400	0,861	48,560
11	R	764712028	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm, š. 300mm	m	391,200	19,044	7 450,013
16	R	764721119	Oplechovanie rls Lindab rš 700 mm	m	56,400	18,374	1 036,294
0	R	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,000	9,207	18,414
<b>767</b>			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>5 006,215</b>
20	R	767584342	Oprava podhľadov kazetových, s plochou nad 10 do 20 m <sup>2</sup>	m2	16,200	8,888	143,986
37	R	767631325	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 3000 mm x výšky 1500 mm	ks	8,000	52,874	422,992
28	611	6114119000	Plastové okno SALAMANDER dvojkričlové otváracé, otvaravo-sklonné výšky/šírky 1300/2100 mm	ks	8,000	528,927	4 231,416
18	R	767631800	Demontáž okien pre beztrmelové zasklenie konštrukcie, včítane zasklenia, -0,06500t	m2	36,000	4,260	153,360
0	R	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,100	49,510	54,461
<b>784</b>			<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>16,268</b>
38	R	784499901	Ostatné práce - zakryvanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku Celkom	m2	67,500	0,241	16,268
			<b>Celkom</b>				<b>189 241,933</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády /zatepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Zateplenie steny juhovýchodnej JFC/	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad		
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo      Spracoval	Dňa	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	74 148,95	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	22 251,37	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	11 106,10	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	107 506,42	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		107 506,42
<b>Objednávateľ</b>					24 DPH 20,00 % z 107 506,42		21 501,28
Dátum a podpis					25 Cena s DPH (r. 23-24)		129 007,70
<b>Zhotoviteľ</b>					<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa		0,00
					27 Kľzavá doložka		0,00
					28 Zvýhodnenie + -		0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Administratívna budova /AB/ Šišáňkova 18, Humenné-rekonštr. fasády/zatepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./

Objekt: SO-02 Zateplenie steny juhovýchodnej/PC/

Objednávateľ: SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 12. 2012

JKSO:

Kód	Popis	Dotácia	Minim.	Časť celkom	Hutnosť celkom	Dot. celkom
HSV	Práce a dodávky/HSV	0,000	74 148,948	74 148,948	422,582	0,000
3	Zvlášť kompletné konštrukcie	0,000	1 893,472	1 893,472	8 199	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	48 794,501	48 794,501	16,889	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-buranie	0,000	23 760,976	23 760,976	386,404	0,000
HSV	Práce a dodávky/HSV	22 251,369	9 306,048	31 557,417	10 179	6 514
713	Izolácie tepelné	2 616,389	1 749,211	4 365,600	0,000	0,000
764	Konštrukcie kľampárske	0,000	582,707	582,707	0,172	0,088
767	Konštrukcie kopolikové kovové	19 635,000	6 929,751	26 564,751	0,000	6,448
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	44,400	44,400	0,007	0,000
M	Práce a dodávky/M	0,000	1 800,000	1 800,000	0,000	0,000
21-M	Elektromotory	0,000	1 800,000	1 800,000	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>22 251,369</b>	<b>85 255,048</b>	<b>107 506,417</b>	<b>422,761</b>	<b>6,514</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády /zatepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./  
 Objekt: SO 02 Zateplenie steny juhovýchodnej JFC/

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 17. 12. 2012

Objednávateľ: SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>74 148,949</b>
<b>3</b>			<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>1 593,472</b>
7	R	311273120	Murivo nosné z tvárníc YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P4-500	m3	13,320	119,630	1 593,472
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>48 794,501</b>
25	R	612421615	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	35,520	5,127	182,111
26	R	612421626	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	35,520	5,705	202,642
15	R	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklolextilnou mriežkou	m2	35,520	3,343	118,743
14	R	622464225	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 3 mm	m2	937,294	16,332	15 307,886
2	R	625251050	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 5cm bez omietky	m2	399,213	36,016	14 378,055
11	R	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 5cm bez omietky	m2	235,620	19,408	4 572,913
10	R	6252511001	Zateplenie doskami STYRCON 200 hr.10cm bez omietky-schodiská	m2	225,831	47,520	10 731,489
12	R	6259911001	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr.10cm bez omietky	m2	76,630	25,023	1 917,512
13	R	625251101	Vyrovnanie sten STYRCONOM a Polystyrénom 20 %	m2	60,492	22,865	1 383,150
<b>9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>23 760,976</b>
3	R	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1 229,940	1,785	2 195,443
4	R	941941292	Prípatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	4 917,600	1,513	7 440,329
16	R	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1 229,400	1,072	1 317,917
20	R	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 229,400	1,211	1 488,803
18	R	9451000	Oprava statickej poruchy celej steny -/ pozostáva z prác: vodný lúč D+M uhlíkovej lamely š.12 cm D+M sanačnej omietky hr. 2-4 cm odvoz sute na skládku 5 km	m	40,000	128,255	5 130,200
27	R	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	t	68,230	67,436	4 601,158
28	R	998012025	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.beťónová výšky do 48 m	t	69,108	20,600	1 423,625
29	R	998100	Poplatok za skládku	t	6,514	25,100	163,501
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>31 557,468</b>
<b>713</b>			<b>Izolácie tepelné</b>				<b>4 388,580</b>
1	R	713135121	Montáž tepelnej izolácie stien, výplň medzi výstupkami	m	570,400	2,935	1 674,124
30	631	6314152510	Tepelná izolácia hrúbky 100 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m3	18,058	144,887	2 616,369
0	R	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	50,719	1,480	751,087

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády /zatepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./  
 Objekt: SO 02 Zateplenie steny juhovýchodnej /FC/

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 17. 12. 2012

Objednávateľ: SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad  
 Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

764		Konštrukcie klampiarske		582,707			
5	R	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	29,700	0,861	25,572
6	R	764721119	Oplechovanie ríms Lindab rš 700 mm	m	29,700	18,374	545,708
0	R	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	5,771	1,980	11,427

767		Konštrukcie doplnkové kovové		26 564,781			
21	R	767111130	Montáž stien zasklenených plastových s 1x sklápacie okno	ks	10,000	113,260	1 132,600
22	597	5971	Dodávka plastových presklenných stien s 1 x okno vyklápacie s pákovým mechanizmom	ks	10,000	652,500	6 525,000
23	R	767111140	Montáž stien zasklenených plastových šikmých s pevným zasklením	ks	10,000	155,230	1 552,300
24	597	5972	Dodávka presklenných stien šikmých pevných	ks	10,000	1 311,000	13 110,000
8	R	767112812	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zvaraných, -0,03300t	m2	195,330	8,800	1 718,904
19	R	767998P	Uprava konštrukcií pri montáži presklenných stien	ks	20,000	115,000	2 300,000
9	R	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	205,434	1,100	225,977

784		Dokončovacie práce - maľby		44,400			
31	R	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	35,520	1,250	44,400

**M Práce a dodávky M 1 800,000**

21-M		Elektromontáže		1 800,000			
0	R	210010001	Demontáž a montáž bleskozvodu - vid' samostatný rozpočet Celkom	kpl	1,000	1 800,000	1 800,000

**Celkom 107 506,417**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády /zatepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Zateplenie steny severozápadnej	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		17.12.2012	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	62 425,70	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	22 473,83	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	9 466,27	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-8)	94 365,60	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant					D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		94 365,60
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 94 365,60		18 873,12
Dátum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)		113 238,72
Zhotoviteľ					E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa		0,00
					27 Kľzavá doložka		0,00
					28 Zvýhodnenie +-		0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Administratívna budova IAB/ Štefánikova 18, Hútenárske-ekónstr. fasády /zatepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./

Objekt: SO 03 Zateplenie steny severozápadnej

Objednávateľ: SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad

Zhotoviteľ:

Dátum: 17.12.2012

JKSO:

KW	Plán	Doklady	Monitor	Deň počet	Finančný počet	Súčet celkom
RSV	Práce a opisy RSV	0,000	82 425,701	82 425,701	370,538	0,000
3	Zvlášť a kompletne konštrukcie	0,000	1 911,088	1 911,088	11,032	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenia	0,000	43 988,625	43 988,625	18,986	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce buranís	0,000	16 525,787	16 525,787	143,518	0,000
RSV	Práce a opisy RSV	22 473,625	9 486,274	31 959,900	0,180	6,514
713	Izolácie tepelné	2 838,628	1 820,307	4 658,933	0,000	0,000
764	Konštrukcie kámparske	0,000	582,707	882,707	0,172	0,068
767	Konštrukcie doplnkové kovové	19 635,000	7 010,010	26 645,010	0,000	6,446
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	83,250	83,250	0,009	0,000
<b>Celkom</b>		<b>22 473,625</b>	<b>71 891,975</b>	<b>94 365,601</b>	<b>370,716</b>	<b>6,514</b>



# ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády /zatepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./

Objekt: SO 03 Zateplenie steny severozápadnej

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 12. 2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>62 425,701</b>	<b>370,535</b>
<b>3 Zvislá a kompletné konštrukcie</b>						<b>1 911,089</b>	<b>11,032</b>
4	311273120	Murivo nosné z tváric YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P4-500	m3	15,975	119,630	1 911,089	11,032
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenia</b>						<b>43 988,825</b>	<b>15,985</b>
22	612421615	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápencementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	42,600	5,127	218,410	1,404
23	612421626	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápencementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	42,600	5,705	243,033	1,563
12	622464225	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 3 mm	m2	824,599	16,332	13 467,351	3,381
7	625251050	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 5cm bez omietky	m2	399,213	36,016	14 378,055	8,200
9	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 5cm bez omietky	m2	145,440	18,408	2 822,700	1,417
8	6252511001	Zateplenie doskami STYRCON 200 hr.10cm bez omietky-schodiská	m2	203,316	47,520	9 661,576	0,000
10	6259911001	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr.10cm bez omietky	m2	76,630	25,023	1 917,512	0,000
11	625251101	Vyrovnanie sten STYRCONOM a Polystyrénom 20 %	m2	55,989	22,865	1 280,188	0,000
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>16 525,787</b>	<b>343,518</b>
2	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1 065,400	1,785	1 901,739	171,733
3	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	4 261,600	1,513	6 447,801	0,000
13	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1 065,400	1,072	1 142,109	171,732
15	944944103	Ochranná sieť na boku-lešenia zo siete Baumit	m2	1 065,400	1,211	1 290,199	0,053
24	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	t	63,010	67,436	4 249,142	0,000
25	998012025	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 48 m	t	64,626	20,600	1 331,296	0,000
14	998100	Poplatok za skládku	t	6,514	25,100	163,501	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>31 939,900</b>	<b>0,180</b>
<b>713 Izolácie tepelné</b>						<b>4 658,933</b>	<b>0,000</b>
1	713135121	Montáž tepelnej izolácie stien, výplň medzi výstupkami	m	593,600	2,935	1 742,216	0,000
26	6314152510	Tepelná izolácia hrúbky 100 mm, roľovaný výrobok z minerálnej vlny	m3	19,592	144,887	2 838,626	0,000
0	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	45,074	1,733	78,091	0,000
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>						<b>592,707</b>	<b>0,172</b>
27	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	29,700	0,861	25,572	0,000
28	764721119	Oplechovanie ríms Lindab rš 700 mm	m	29,700	18,374	545,708	0,172
0	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	5,771	1,980	11,427	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 25 645,010 0,000**

17	767111130	Montáž stien zasklenených plastových s 1x sklápacie okno	ks	10,000	113,260	1 132,600	0,000
18	5971	Dodávka plastových presklenných stien s 1 x okna vyklápacie s pákovým mechanizmom	ks	10,000	652,500	6 525,000	0,000
19	767111140	Montáž stien zasklenených plastových šikmých s pevným zasklením	ks	10,000	155,230	1 552,300	0,000
20	5972	Dodávka presklenných stien šikmých pevných	ks	10,000	1 311,000	13 110,000	0,000
5	767112812	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zvaraných, -0,03300t	m2	195,330	8,800	1 718,904	0,000
21	767998P	Uprava konštrukcií pri montáži presklenných stien	ks	20,000	115,000	2 300,000	0,000
6	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	278,369	1,100	306,206	0,000

**784 Dokončovacie práce - maľby 53,250 0,009**

16	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	42,600	1,250	53,250	0,009
----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

**Celkom 94 365,601 370,716**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády /zatepl. fasády a výmena výplní. konštr.v spol. pr./	JKSO	
Názov objektu	Aktívnybleskozvod	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		17.12.2012	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimoslav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	1 192,18				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	487,04				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 679,22	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		120,78
<b>Projektant</b>							<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		1 800,00
<b>Objednávateľ</b>							24	DPH 20,00 % z 1 800,00		360,00
Dátum a podpis				Pečiatka			25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>2 160,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>							<b>E Prípochy a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa		0,00
							27	Kľzavá doložka		0,00
							28	Zvýhodnenie + -		0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Administratívna budova /AB/ Štefánikova 14, Humenné-rekonštr. fasády (zálepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol.pr.)

Objekt: Aktívnybleskozvod

Objednávateľ: SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 12. 2012

JKSO:

Kód	Popis	Dokladná	Merita	Cena celkom	Príloha celkom	Dotácia celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce v štruktúry M	1 192,180	487,039	1 800,002	0,000	0,000
21-M	Elektronika	1 192,180	402,885	1 595,075	0,000	0,000
48-M	Zemné práce pri exteriorných prácach	0,000	84,144	84,144	0,000	0,000
OS	Dalšie	0,000	0,000	120,783	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>1 192,180</b>	<b>487,039</b>	<b>1 800,002</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova /AB/ Štefánikova 18, Humenné-rekonštr. fasády /zatepl. fasády a výmena výplň. konštr.v spol. pr./

Objekt: Aktívny bleskozvod

JKSO:

EČO:


Objednávateľ: SR- Finančné riaditeľstvo SR, SR-Katastrálny úrad

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 12. 2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>1 800,002</b>	<b>0,000</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>						<b>1 595,075</b>	<b>0,000</b>
1	210172107	Montáž zvodu	m	98,300	0,604	59,373	0,000
2	3450710500	Rúrka FXP 50	m	101,249	0,707	71,583	0,000
3	210210551	Montáž aktívneho bleskozvodu	ks	1,000	209,887	209,887	0,000
4	3544245900	Aktívny bleskozvod - zachytávač, označenie FRANKLINPLUS WAT 425, výkon 60	ks	1,000	813,665	813,665	0,000
5	354910E101	Tyč základná, nerezová : ZTN3 3m	ks	1,000	43,262	43,262	0,000
6	354910E103	Tyč nadstavňá, nerezová 1NTN3 3m, prvá	ks	1,000	47,974	47,974	0,000
7	354910E371	Stojan na plochú strechu: TPSS, FeZn, trojnožka	ks	1,000	69,819	69,819	0,000
8	354910E951	Pristušenstvo pre ukotvenie trojnožky TPSS	balenie	1,000	38,551	38,551	0,000
9	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	118,300	0,771	91,209	0,000
10	1561522500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8,00mm	kg	46,610	0,702	32,720	0,000
11	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	88,725	0,317	28,126	0,000
12	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	1,542	3,084	0,000
13	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	0,604	1,208	0,000
14	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	6,000	0,553	3,318	0,000
15	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	6,000	6,425	38,550	0,000
16	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	6,000	6,939	41,634	0,000
17	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	1,000	0,792	0,792	0,000
18	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	1,000	0,120	0,120	0,000
<b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>						<b>84,144</b>	<b>0,000</b>
19	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	20,000	2,420	48,400	0,000
20	460560153	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	20,000	1,405	28,100	0,000
21	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	7,000	1,092	7,644	0,000
<b>OST Ostatné</b>						<b>120,783</b>	<b>0,000</b>
22	2132999082	Demontáž bleskozvodu	hod	16,000	2,998	47,968	0,000
23	2132999083	Funkčná skúška aktívnej časti bleskozvodu vrátane vypracovania PD	ks	1,000	38,551	38,551	0,000
24	2132999084	Východzia revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	8,000	4,283	34,264	0,000
<b>Celkom</b>						<b>1 800,002</b>	<b>0,000</b>

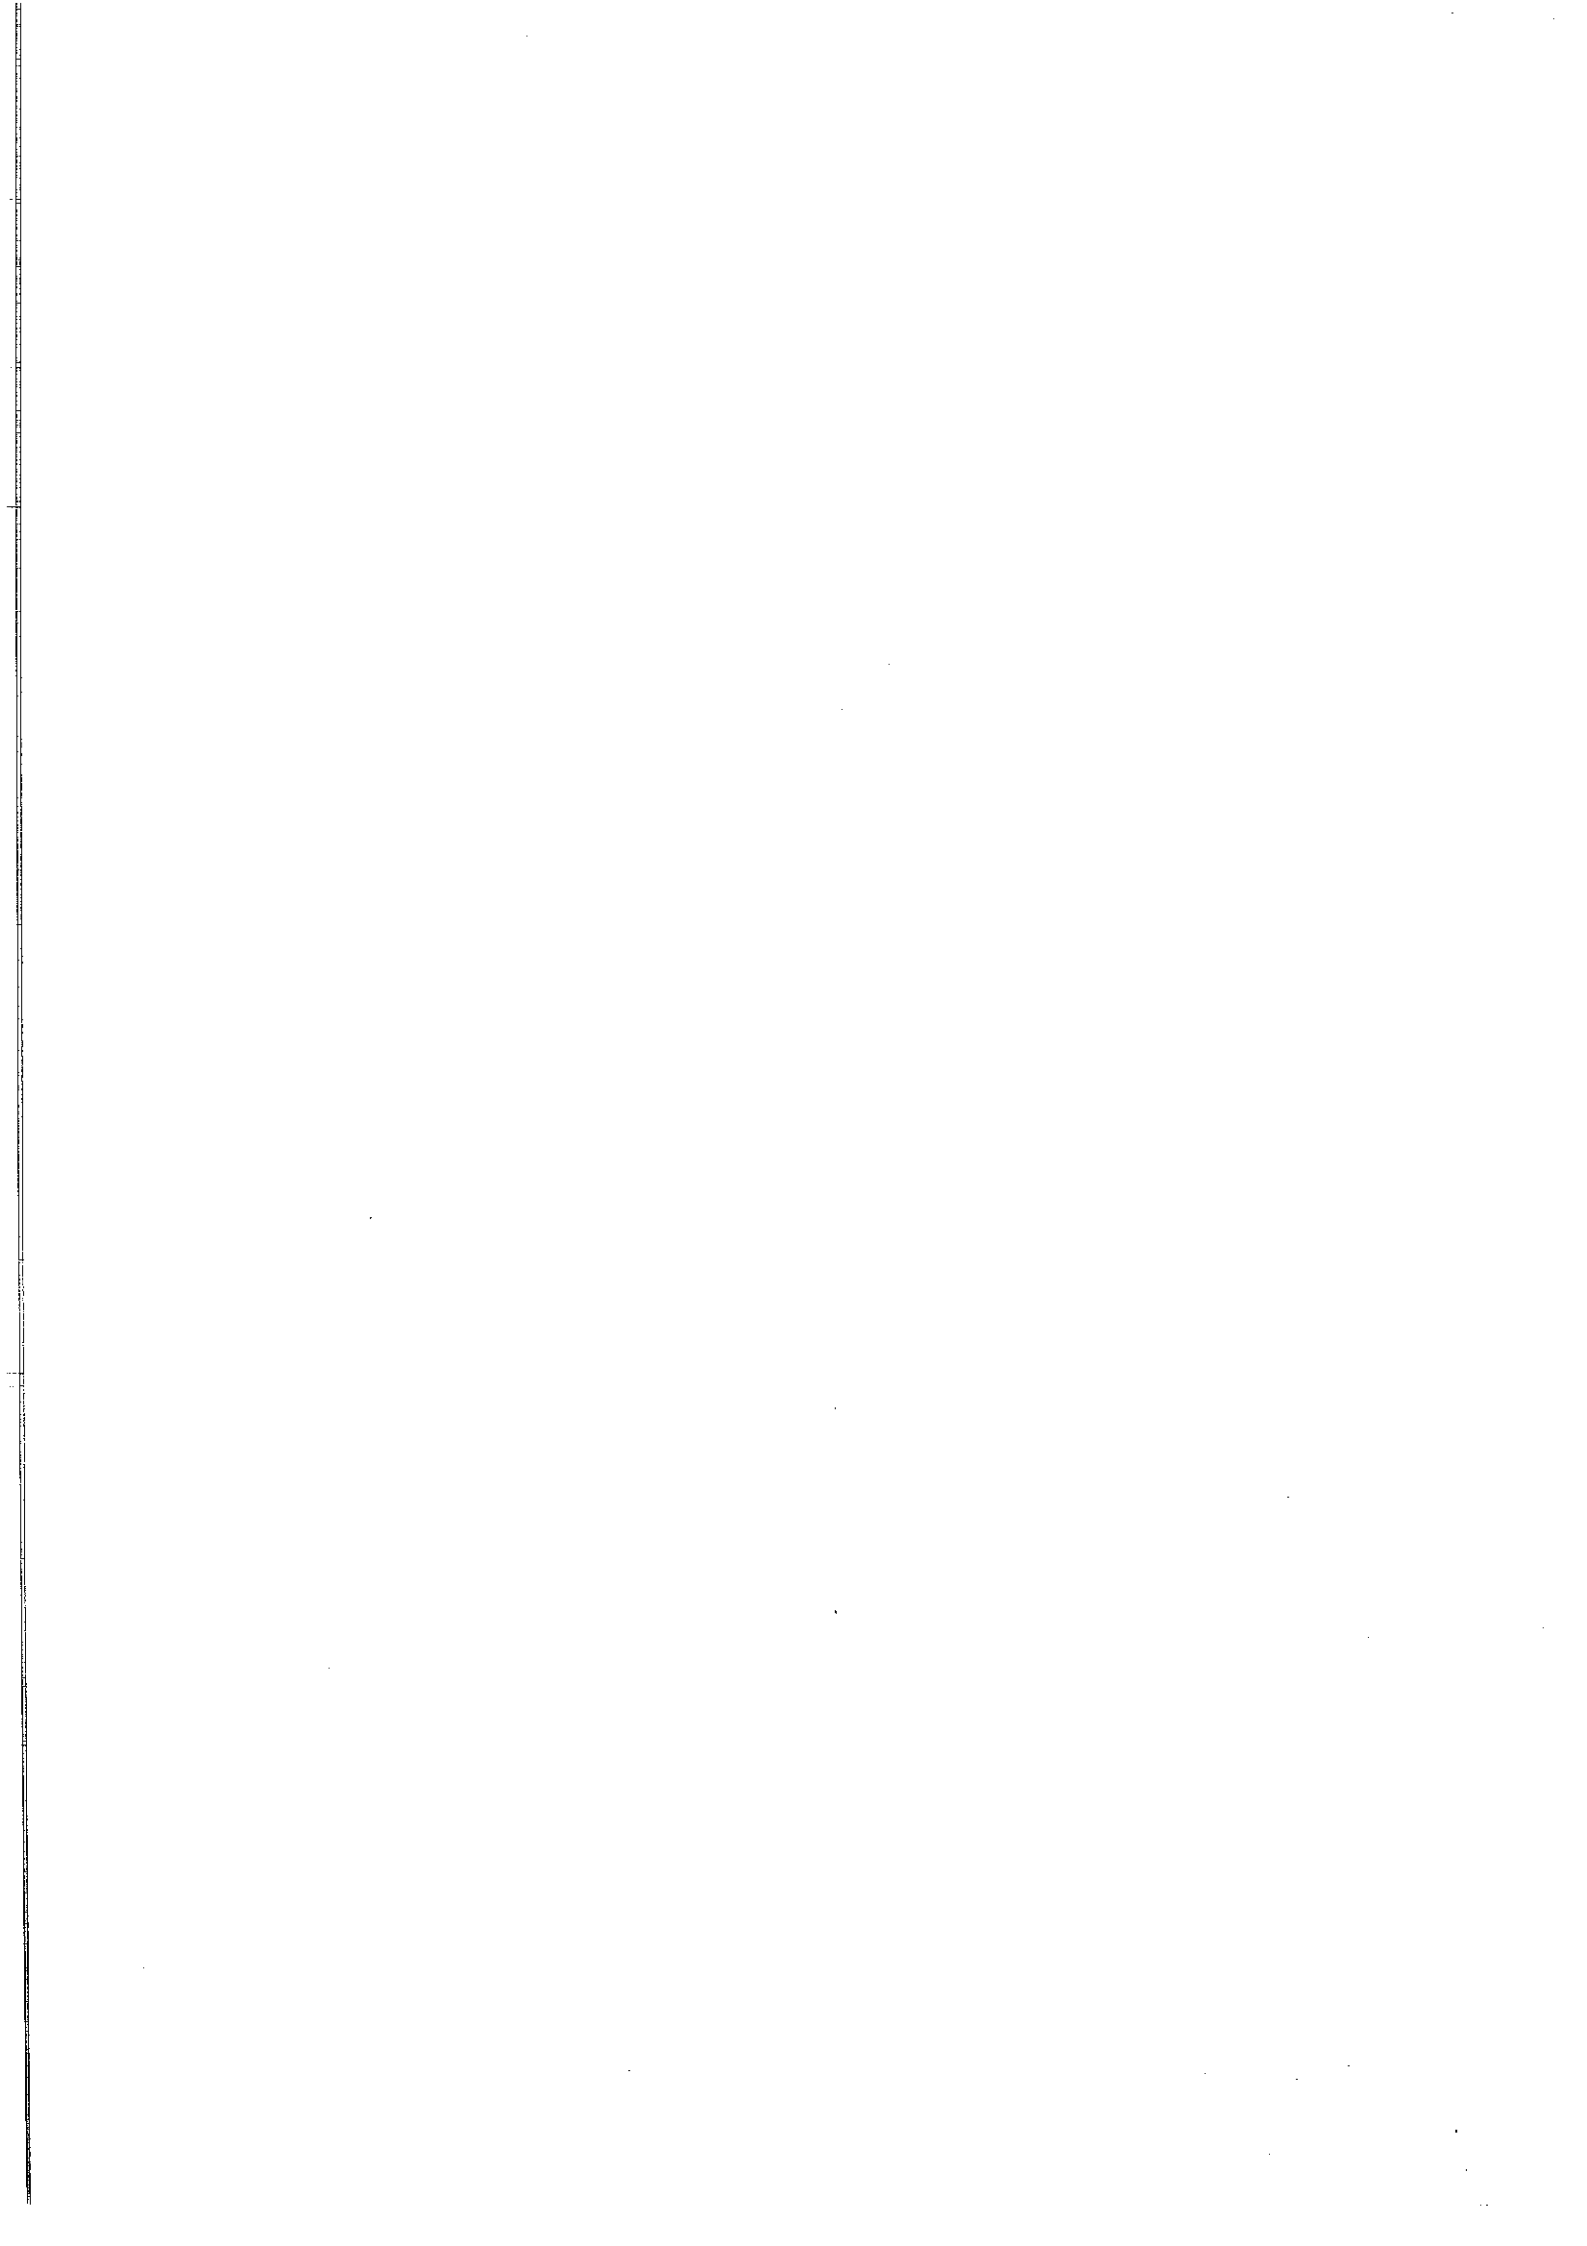




**CHEMKOSTAV HSV akciová spoločnosť,**  
**Štefánikova 18, 066 01 HUMENNÉ**


fax: [redacted]  
E-mail: [redacted] URL: [redacted]

**„Administratívna budova (AB)  
Štefánikova 18, Humenné – rekonštrukcia fasády (zateplenie fasády  
a výmena výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch)“**

**Stavebný rozpočet na CD**

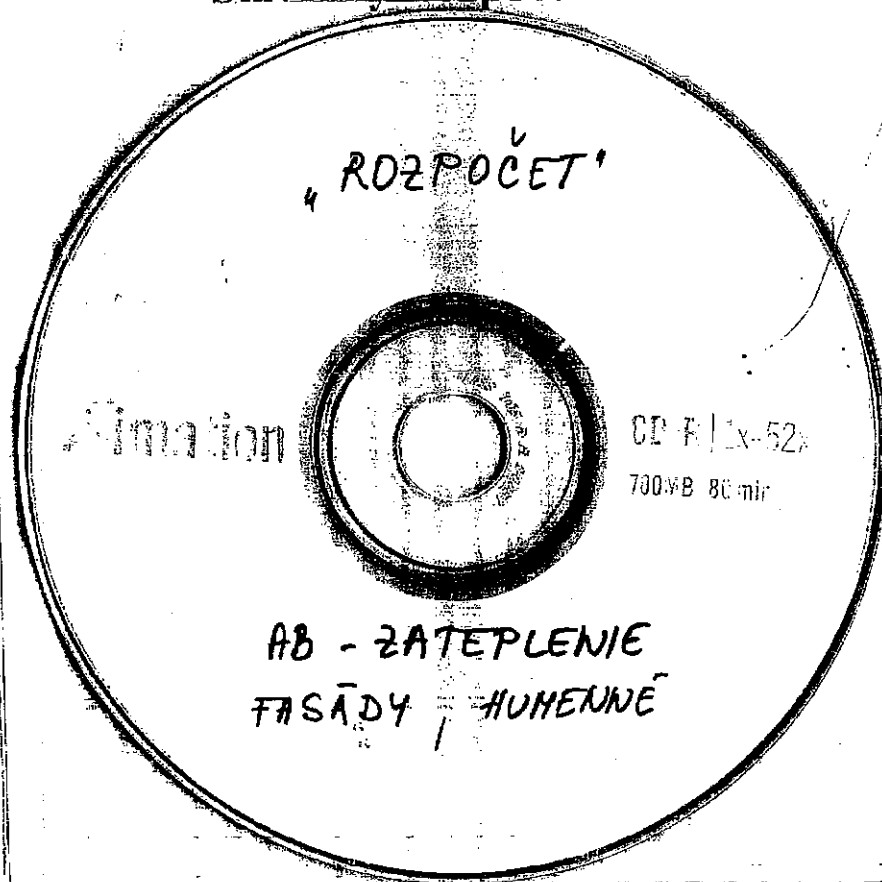

V Humennom, dňa 21.12.2012



[redacted]  
Ing. Milan Mňaboncák  
predseda predstavenstva

**Chemkostav HSV**  
akciová spoločnosť  
Humenné

Viktória Gajdošová  
člen predstavenstva  
[redacted]



# CERTIFIKÁT

**TÜV SÜD Slovakia s.r.o. – CERTIFIKAČNÝ ORGÁN**

certifikujúci systémy manažérstva kvality

akreditovaný SNAS

osvedčenie o akreditácii č. Q 011

potvrďuje, že organizácia



**Chemkostav HSV akciová spoločnosť**

Štefánikova 18

SK – 066 01 Humenné

IČO: 36 473 332

zaviedla a používa  
systém manažérstva kvality v oblasti

**Realizácia priemyselných, bytových, občianskych  
a inžinierskych stavieb.**

Audítom, správa č. 0138/40/12/Q/AS/R2


bolo preukázané, že sú splnené  
požiadavky normy

**STN EN ISO 9001:2009**

Certifikát je platný do 2015-03-30

Registračné číslo certifikátu Q 0138-3

Bratislava, 2012-04-04




TÜV SÜD Slovakia s.r.o. – certifikačný orgán  
člen skupiny TÜV SÜD  
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava



OSVEDCUJEM, ZE TATO LISTINA DOSLOVNE SUHLASI  
S PREDLOZENYM ORIGINALOM (OSVEDCENIM OD PISOM).  
SKLADAJUCIM SA Z ..... 7 ..... STRAN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČASTOČNÝ), NA LISTINE BO LI VYKONANÉ  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa: 20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT  
◆ 認証証書 ◆



# CERTIFIKÁT

**TÜV SÜD Slovakia s.r.o. – CERTIFIKAČNÝ ORGÁN**

certifikujúci systémy environmentálneho manažérstva

akreditovaný SNAS

osvedčenie o akreditácii č. R 006

potvrďuje, že organizácia



**Chemkostav HSV akciová spoločnosť**

Štefánikova 18

SK – 066 01 Humenné

IČO: 36 473 332

zaviedla a používa  
systém environmentálneho manažérstva v oblasti

**Realizácia priemyselných, bytových, občianskych  
a inžinierskych stavieb.**

Auditom, správa č. 0138/40/11/E/AS/R1

bolo preukázané, že sú splnené  
požiadavky normy

**STN EN ISO 14001:2005**

Certifikát je platný do 2014-05-15

Registračné číslo certifikátu E 0138-2

Bratislava, 2011-05-16



TÜV SÜD Slovakia s.r.o. – certifikačný orgán  
člen skupiny TÜV SÜD  
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

F-Q-019/3/4


OSVEDCUJEM, ZE TATO LISTINA DOSLOVNE SUHLASI  
S PREDLOZENYM ORIGINALOM (OSVEDCENIM ODPISOM),  
SKLADAJUCIM SA Z .....?..... STRAN, IDE O ODPIS  
UPLNY (CISTOCENNY), NA LISTINE BOLI VYKONANE  
TIETO ZMENY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Miestnosti, dňa 20. 12. 2012

██████████  
PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM ██████████



██████████  
██████████  
██████████



# CERTIFIKÁT

**TÜV SÜD Slovakia s.r.o. – CERTIFIKAČNÝ ORGÁN**  
certifikujúci systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
akreditovaný SNAS  
osvedčenie o akreditácii č. R 018  
potvrďuje, že organizácia



**Chemkostav HSV akciová spoločnosť**  
Štefánikova 18  
SK – 066 01 Humenné  
IČO: 36 473 332

zaviedla a používa  
systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti

**Realizácia priemyselných, bytových, občianskych  
a inžinierskych stavieb.**

Audítom, správa č. 0138/40/12/BIAS/R1


bolo preukázané splnenie  
požiadaviek normy

**STN OHSAS 18001:2009**

Tento certifikát je platný do **2015-05-04**

Registračné číslo certifikátu **B 0138-2**

Bratislava, 2012-05-05



TÜV SÜD Slovakia s.r.o. – certifikačný orgán  
člen skupiny TÜV SÜD  
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

OSVEDČUJEM, ŽE TATO LISTINA DOBROUŠNE SÚHLASÍ  
S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM (OSVEDČENÍM ODPISOM),  
SKLADAJÚCIM SA Z 1 STRÁN, IDE O ODPIS  
ÚPLNÝ (ČI ČASŤOČNÝ). NA LISTINE BOLI VYKONANÉ  
TIETO ZMĚNY, DOPLNKY: \_\_\_\_\_

V Humennom, dňa 20. 12. 2012

PRACOVNÍK POVERENÝ  
NOTÁROM \_\_\_\_\_



